आज मिति २०८२ साल भदौ महिनाको १६ गतेका दिन यस स्वर्गद्वारी नगरपालिकाको आ०व० २०८१/०८२ को सम्पादित कार्यक्रमहरुको वार्षिक समिक्षा कार्यक्रम यस स्वर्गद्वारी नगरपालिकाको नगर उप-प्रमुख श्री मित्र राज रानामगर ज्यूको अध्यक्षतामा संचालन गरी सम्पन्न गरियो। कार्यक्रममा तपसिल बमोजिमका व्यक्तिहरुको उपस्थिती थियो।

उपस्थिती

१- श्री मित्रराज रानामगर नगर उप-प्रमुख स्वर्गद्वारी नगरपालिका
२- " कुशावराज भट्टराई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत "
३- " मेघराज केशरी वडा अध्यक्ष वडा नं. १
४- " बुद्धिराम पुनमगर " " " २
५- " कृष्ण बहादुर रोकाय " " ३
६- " सुवर्ण कुमार डाँगी " " ४
७- " शेर बहादुर घर्तीमगर " " ५
८ " शेर बहादुर रोकाय " " ६
९ " सुरज जि.एम " " ७
१० " रुप बहादुर राउत " " ८
११ " नर बहादुर वि.एम " " ९
१२ " अमृता बुढाथोकी कार्यपालिका सदस्य
१३ " शारदा बुढाथोकी " "
१४ " शिवा केशरी " "
१५ " सुरज संगम सुनार नगर प्रवक्ता
१६ " पुरुषोत्तम बराल का०पा० सदस्य
१७ " दल बहादुर केसी जं.स्वा.प्र.
१८ " क्षमा महतरा सब इन्जिनियर
१९ " टिका के.सी. ७ नं. वडा सचिव
२० " लोकेन्द्र खड्का ६ नं वडा सचिव
२१ हिट बहादुर बुढा ८ नं. वडा सचिव
२२. " मंजु कलेल साकी कृषि शाखा प्राविधिक सि.
२३ " प्रतिक्षा अधिकारी प्राविधिक अधिकृत
२४ " त्रिविक्रम रावत अ.स.ई.
२५ " ईश्वर आचार्य प्राविधिक अधिकृत
२६ " मानव थापा इन्जिनियर
२७. श्री समिर पोखरेल - स.ई.
२८ गोकर्ण प्र. भण्डारी स.ई.
२९ संजय चौधरी थारु व.कृषि विकास अधिकृत
३० नरेन्द्र प्रसाद भण्डारी एम आइ एस अपरेटर

३१	पुजा पोखरेल	अमिन स्व.न.पा.
३२	राजेन्द्र खड्का	सब इन्जिनियर स्व.न.पा.
३३.	रमेश पोखरेल	रोजगार संयोजक - स्वर्गद्वारी नं.पा.
३४	किशोर पुन मगर	जिल्ला प्रमुख [illegible]
३५	विमल थापा	कृषि प्राविधिक स्व.न.पा.
३६	शोभाराम रोका	जिल्ला प्रमुख "
३७	बालाराम विक	वडा सचिव ५ नं. वडा कार्यालय
३८	वविता विक	[illegible] - ४
३९	किशोर कुमार डि.सी.	किडो नेपाल VSTA प्यूठान
४०	कोसिला नेपाली	[illegible]
४१	अम्बिका पुन मगर	उप प्रमुख सचिवालय [illegible]
४२	पार्वती कुमारी द्विवेदी	सि.अ.न.मि. सिनियर स्वास्थ्य शाखा
४४	[illegible] भण्डारी	आमा [illegible]
४५	दुर्गा प्रसाद गैराखोली	जि.स्वा.नि. स्व.नं.पा.
४६	सीता अधिकारी	पोषण सहजकर्ता स्व.न.पा.
४७	हेम राज आचार्य	पशु चिकित्सक पशु सेवा शाखा
४८.	मिना अधिकारी	पि.स्वा.प्र. "
४९	फन बहादुर गहराई	[illegible]
५०	आयुषा जोशी	स्व.न.पा. [illegible] अधिकृत
५१	प्रोमिला योगी	[illegible]
५२	विष्णु खनाल	[illegible]

प्रस्ताव तथा निर्णयहरु

प्रस्ताव नं १ आ.व. २०८१/८२ को पालिका तथा संघ सस्थावाट सञ्चालित आयोजना तथा कार्यक्रमको प्रगतीको समिक्षा सम्वन्धमा ।

प्रस्ताव नं २. समग्र पक्षको समिक्षा सम्वन्धमा ।

निर्णय नं १ . यस स्वगद्वारी नगरपालिकाको आ.व.२०८१/८२ को पालिका तथा संघ सस्थावाट सञ्चालित आयोजना तथा कार्यक्रमको प्रगतिको निम्नानुसार समिक्षा गरियो ।

स्वर्गद्वारी नगरपालिकाको संक्षिप्त परिचय

स्वर्गद्वारी नगरपालिका नेपालको लुँम्विनी प्रदेश अन्तर्गत प्युठान जिल्लामा पर्दछ । भौगोलिक हिसाबले ८२°४५ देखि ८२°५७३०ू पूर्वी देशान्तर र २७°५३३०ू देखि २८°०३ उत्तरी अक्षांशमा अवस्थित रहेको छ । करीब २२४.७० व.कि.मी. क्षेत्रफल रहेको यस नगरपालिकाको उत्तरमा रोल्पा जिल्ला, पश्चिमतिर दाङ र रोल्पा जिल्ला र दक्षिणमा दाङ जिल्ला र माण्डवी गाउपालिका रहेका छ । साविकका गाविसहरु कोचीवाङ, स्वर्गद्धारी, भिंग्री, सारी, वेलवास, वर्जीवाङ र गोठीवाङ गाविसहरुलाई समेटेर ९वटा वडाहरु कायम गरि मिती २०७३ फाल्गुन २२ गते स्वर्गद्वारीनगरपालिका घोषणा गरीएको थियो । उष्ण, समशितोष्ण र शितोष्ण हावापानी भएको यस स्वर्गद्धारीको अधिकतम तापक्रम ३३.५ डिग्री सेल्सियस, न्युनतम तापक्रम ११.८ डिग्री सेल्सियस रहेको पाईन्छ । यस नगरपालिकामा विभिन्न जातजाती तथा धर्म मान्ने व्यक्तिहरुको बसोबास रहेको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्याङ्क अनुसार यस नगरपालिकामा ८३७६ घरपरिवार रहेका छन भने नगरपालिकाको जनसंख्या ३२१२७ रहेको छ । जसमध्ये पुरुष ४३.७० प्रतिशत (१४०४१ जना) र महिला ५६.३० प्रतिशत (१८०८६ जना) र सवैभन्दा वढी मगर जातीको संख्या रहेको छ । क्षेत्रको रुपमा रहेको यस स्वर्गद्धारी नगरपालिकामा ब्यापार, उद्योग, कलकारखाना, प्राकृतिक श्रोत तथा सामाजिक महत्वका क्षेत्रहरु रहेका छन् । औषत पारिवारिक आम्दानीमा कृषि व्यवसायको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा रहेको छ र स्थानीय बासिन्दाको आम्दानीको अर्को मुख्य श्रोतको रुपमा वैदेशिक रोजगारी पनि एक हो । विभिन्न समुदाय, जातजातीका मानिसको बसोबास रहेको यस क्षेत्रमा विभिन्न चाडपर्व मनाउने गरिन्छ । दशैं, तिहार, तिज, माघि, होलि, ल्होसार, कृष्णजन्माष्टमी, बुद्धजयन्ती, आदि यहाँका प्रमुख चाड पर्वका रुपमा रहेका छन भने प्रसिद्ध तिर्थस्थल स्वर्गद्धारी पनी यसै नगरपालिकामा पर्दछ ।

कार्यरत कर्मचारी विवरण

स्वीकृत स्थायी कर्मचारी दरबन्दी संख्या : ५६

कार्यरत स्थायी कर्मचारी संख्या : ३५

पदपूर्ति हुन बाँकि : २१

कार्यरत करार कर्मचारीहरुको संख्या : ४० (संघिय,प्रदेश समेत)

दैनिक ज्यालादारीमा कार्यरत संख्या : २

नगरपालिका अनुदान शिक्षक विवरण

नगरपालिका अनुदान शिक्षक विवरण

सि.नं	विद्यालयको नाम	शिक्षकको नाम	तह
1	श्री वेलवास मा.वि	दिवश पोखेल	मा.वि.
2	श्री विद्यानन्द मा.वि	रिमा घर्ती	मा.वि.
3	वालतपस्वी वेद गुरुकुलम	सरोज पौडेल	मा.वि.
4	वाल मा.वि. अडेवास	विमला	मा.वि.
5	वाल सस्कृत मा.वि.धरमपानी	कमला पोखेल	मा.वि.
6	ने.रा.मा.वि. कोचिवाङ	माधुरी रावल	मा.वि.
7	सूर्योदय मा.विद्यालय	वेगम बसेल	मा.वि.
8	नेरा आ.वि. खलधारा	शीवराज रेग्मी	निमावि
9	नेरा आ.वि. खलधारा	वेली अधिकारी	निमावि
10	शिद्वेश्वरी आ.वि. नेवारे	माधव प्रसाद बन्जारे	निमावि
11	शिद्वेश्वरी आ.वि. नेवारे	लाल बहादुर भण्डारी	निमावि
12	वालज्योती पा.वि. सोत्रे	ललिता घर्ती	प्रा.वि.
13	वाल मा.वि. अडेवास	केसरी पुन	प्रा.वि.
14	जनजागृती प्रा.वि.. किमिचौर	निमा घर्ती	प्रा.वि.
15	जन सम्पर्क पा्र.वि. तिमिले	नरेन्द्र जि.एम.	प्रा.वि.
16	वाल सस्कृत मा.वि.धरमपानी	सरस्वती खनाल	प्रा.वि.
17	वाल शिक्षा प्रा.वि. वर्तन	यमराज खत्री	प्रा.वि.
18	छेडा पोखरा प्रा.वि.	मिन ब. सुनार	प्रा.वि.
19	जनता प्रा.वि. कालिपोखरी	रविना थारु	प्रा.वि.
20	अम्वेश्वरी प्रा.वि. रुम	रोम बहादुर कालाथोकी	प्रा.वि.
21	जनउज्वल प्रावि खन्नेखोला	मनिषा राना मगर	प्रा.वि.
		जम्मा	

संघीय अनुदानका शिक्षकहरु

क्र.स.	विद्यालयको नाम	क्र.स.	शिक्षकको नाम	तह	विषय	मासिक तलव	१२ महिनाको	पर्व खर्च	कुल वार्षिक त.भ.
1	जनता मावि वर्जिवाङ	1	....	मावि (९ १०)	विज्ञान	43689	524268	43689	567957
		2	संगिता रिजाल	मावि (९ १०)	विज्ञान	43689	524268	43689	567957
	सुर्योदय मावि वेलवास	3	रोमलाल भण्डारी	मावि (९ १०)	अंग्रेजि	43689	524268	43689	567957
2		4	....	मावि (९ १०)	गणित	43689	524268	43689	567957
3	वेलवास मावि तापा	5	युवराज विक	मावि (९ १०)	अंग्रेजि	43689	524268	43689	567957
		6	शोभाराम रेग्मी	मावि (९ १०)	विज्ञान	43689	524268	43689	567957
4	नेरा मावि कोचिवाङ	7	....	मावि (९ १०)	गणित	43689	524268	43689	567957
		8	....	मावि (९ १०)	सामाजिक	43689	524268	43689	567957
5	वाल मावि अडेवास	9	अंगद कुमार यादव	मावि (९ १०)	गणित	43689	524268	43689	567957
6	विद्यानन्द मा वि जुद्धावाटा	10	....	मावि (९ १०)	गणित	43689	524268	43689	567957
7	वलसँस्कृत मा वि धरमपानी	11	....	मावि (९ १०)	अंग्रेजि	43689	524268	43689	567957
8	गंगेश्वरी आवि वाजिपुर	12	किशोर कुमार वि सी	आवि (६ ८)	विज्ञान	34430	413160	34430	447590
9	नेरा आवि स्यानिलेख	13	लाली जिएम	आवि (६ ८)	विज्ञान	34430	413160	34430	447590
10	ज्ञानप्रकास आवि तापाकोट	14	ओमप्रकास के सी	आवि (६ ८)	अंग्रेजि	34430	413160	34430	447590
11	शिशुकल्यान आवि दहचौर	15	खिमलाल पौडेल	आवि (६ ८)	अंग्रेजि	34430	413160	34430	447590
			जम्मा			618299	7419588	618299	8037887

आ.व.२०८१/८२ को आय व्ययको अवस्थागत तालिका ।

स्थानीय संचित कोष : स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६९ र ७२ बमोजिम यस पालिकाले वित्तीय हस्तान्तरणबाट प्राप्त अनुदान तथा सहायता, आन्तरिक आम्दानी र स्थानीय सरकारबाट सञ्चालन भएको आयोजनाहरु समेतको आय व्यय हिसाबको आर्थिक बर्ष २०८१।८२ को समग्र संचित कोषको संक्षिप्त अवस्था निम्न बमोजिम रहेको छ।

क्र.सं.	विवरण	आ.व.2081/082 आम्दानी	2081/082 को जम्मा अनुमान	प्रगति प्रतिशत
1	व्यवसाय कर - 11613	25,73,270	22,00,000	116
2	सम्पत्ति कर - 11313	57,27,069.81	50,00,000	114
3	अन्य कर - 11691	9,38,806.10	11,00,000	85.
4	घर।जग्गा बहाल कर - 11321	9,54,701.75	11,00,000	86
5	सरकारी सम्पतीको बहालबाट प्राप्त आय	10,500.00	0.00	०
6	टेण्डर फर्म तथा अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क - 14229	2,73,000.00	2,20,000	124
7	डण्ड तथा जरिवाना - 14312	42,056.00	2,00,000	21
8	नक्सापास दस्तुर - 14242	9,46,540.44	5,00,000	189
9	न्यायिक दस्तुर - 14221	13,215.00	11,000	120
10	नाता प्रमाणित दस्तुर - 14245	1,60,000.00	1,20,000	133
11	शिक्षा क्षेत्रको आम्दानी	1,050.00	11,000	9. 5

12	परीक्षा शुल्क - 14224	27,900.00	1,00,000	27.9
13	बहाल बिरौटी कर - 11322	4,64,140.00	11,00,000	42.5
14	व्यक्तिगत घटना दस्तुर - 14344	5,72,600	600,000.00	95.33
15	सिफारिस दस्तुर - 14243	22,29,500	2,700,000.00	82.07
16	प्रदुषण नियन्त्रण शुल्क	5,16,326	300,000.00	172.67
17	बेरुजु	1,56,748	0.00	0
18	पार्किङ शुल्क	3,00,200	150,000.00	200.33
19	मालपोत (घर जग्गा रजिष्ट्रेसन बापत)	37,35,862.80	4,000,000.00	93.57
20	सवारी साधन कर	1,25,000.00	0.00	0
21	कवाडी	6,10,000.00	4,00,000.00	152.5
22	बिज्ञापन कर	0.00	80,000.00	0

23	गिट्टी बालुवा	63,19,199.88	3,500,000.00	**(४० % प्रदेश संचितकोषमा दाखिला)**
जम्मा नगरपालिका तथा वडा कार्यालयहरुबाट		2,66,91,685.78	23,392,000.00	114. 9

आय			
शीर्षक	प्रस्तावित आय	वास्तविक आय	आम्दानी (%)
संघीय सरकार	५२,०३,१५,०००.००	४७,९७,४२,७८२.७९	९२.२
१३३११ समानिकरण अनुदान	१०,३७,००,०००.००	९,५१,५५,१२०.००	९१.७६
१३३१२ शसर्त अनुदान चालु	२६,५७,१५,०००.००	२४,२३,३५,२२७.७९	९१.२
१३३१३ शसर्त अनुदान पुँजीगत	११,७४,००,०००.००	११,०८,०१,४४४.००	९४.३८
१३३१५ विषेश अनुदान पुँजीगत	३,०५,००,०००.००	२,८४,५७,५७६.००	९३.३

१३३१७ समपुरक अनुदान पुँजीगत	३०,००,०००.००	२९,९३,४१५.००	९९.७८

प्रदेश सरकार	३,३७,८२,०००.००	२,५३,७८,०११.२४	७५.१२
शीर्षक	प्रस्तावित आय	वास्तविक आय	आम्दानी (%)
१३३११ समानिकरण अनुदान	६८,८२,०००.००	६८,८२,०००.००	१००
१३३१२ शसर्त अनुदान चालु	९,००,०००.००	६,३१,६८७.००	७०.१९
१३३१३ शसर्त अनुदान पुँजीगत	१,३५,००,०००.००	९५,३८,१२२.२४	७०.६५
१३३१४ विषेश अनुदान चालु	२०,००,०००.००	१५,६३,३०६.००	७८.१७
१३३१६ समपुरक अनुदान चालु	०	०	०
१३३१७ समपुरक अनुदान पुँजीगत	१,०५,००,०००.००	६७,६२,८९६.००	६४.४१

राजस्व बाडफाड	१३,२८,३२,०००.००	१२,३७,६३,३५४.९४	९३.१७
शीर्षक	प्रस्तावित आय	वास्तविक आय	आम्दानी (%)
११४११ बाँडफाँड भई प्राप्त हुने मूल्य अभिबृद्धि कर	८,८३,२०,७१८.००	७,५०,६७,६०८.५५	८४.९९
११४२१ बाँडफाँड भई प्राप्त हुने अन्त:शुल्क	३,२०,७९,२८२.००	३,२४,०७,५००.९५	१०१.०२
११४५६ बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने सवारी साधन कर	८८,५२,०००.००	१,३९,५३,१११.९९	१५७.६३
११४७२ बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने विज्ञापन कर	८०,०००.००	०	०
१४१५७ बाँडफाँड भई प्राप्त दहत्तर बहत्तरको विक्रिबाट प्राप्त हुने आय	३५,००,०००.००	२३,३५,१३३.४५	६६.७२

३२१२२ बैंक मौज्दात	४,६५,५८,३१९.००	४,५५,६१,५५६.२७	९७.८६
जम्मा	७५,३२,९९,३१९.००	६९,१२,०३,६१२.१४	९१.७५

क्र.सं.	राजस्व संकलन गर्ने कार्यालय	जम्मा	प्रगति	कैफियत
१	स्वर्गद्वारी नगरपालिका, प्युठान	१,९२,६४,९८४.१५	७२.१८	
२	स्वर्गद्वारी नगरपालिका,१ नं. वडा कार्यालय, प्युठान	३,५२,८३२.६४	१.३२	
३	स्वर्गद्वारी नगरपालिका,२ नं. वडा कार्यालय, प्युठान	९,५०,२८८.३९	३.५६	
४	स्वर्गद्वारी नगरपालिका,३ नं. वडा कार्यालय, प्युठान	९,८२,७७४.५१	३.६८	
५	स्वर्गद्वारी नगरपालिका,४ नं. वडा कार्यालय, प्युठान	१२,७२,७४९.७४	४.७७	
६	स्वर्गद्वारी नगरपालिका,५ नं. वडा कार्यालय, प्युठान	९,०१,१४९.७९	३.३८	

७	स्वर्गद्वारी नगरपालिका,६ नं. वडा कार्यालय, प्युठान	५,९६,०९१.९३	२.२३	
८	स्वर्गद्वारी नगरपालिका,७ नं. वडा कार्यालय, प्युठान	७,२२,३६५.३१	२.७१	
९	स्वर्गद्वारी नगरपालिका,८ नं. वडा कार्यालय, प्युठान	६,६५,४३७.३२	२.४९	
१०	स्वर्गद्वारी नगरपालिका,९ नं. वडा कार्यालय, प्युठान	९,८३,०१२.०	३.६८	
जम्मा		२,६६,९१,६८५.७८	१००	

आय				
११३१८ वहाल विटौरी कर	११,८०,०००.००	५,११,५३०.००	४३.३५	६,६८,४७०.००
११४७९ अन्य मनोरञ्जन कर	१,००,०००.००	०.००	०	१,००,०००.००
११६९१ अन्य कर	११,००,०००.००	३,७९,२०७.००	३४.४७	७,२०,७९३.००
१४२१३ अन्य बिक्रीबाट प्राप्त रकम	४५,००,०००.००	२,९८,७००.००	६.६४	४२,०१,३००.००
१४२२१ न्यायिक दस्तूर	१०,०००.००	१६,८००.००	१६८	(६,८००.००)
१४२२४ परीक्षा शुल्क	१,००,०००.००	३६,८००.००	३६.७९	६३,२००.००
१४२२९ अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क	२,००,०००.००	२७,०००.००	१३.५	१,७३,०००.००
१४२४२ नक्सापास दस्तुर	५,००,०००.००	१,१०,९७३.०६	२२.१९	३,८९,०२६.९४
१४२४३ सिफारिश दस्तुर	२५,००,०००.००	२४,७०,४३०.००	९८.८२	२९,५७०.००
१४२४४ व्यक्तिगत घटना दर्ता दस्तुर	५,००,०००.००	५,७१,२००.००	११४.२४	(७१,२००.००)
१४२४५ नाता प्रमाणित दस्तुर	१,००,०००.००	१,५०,२००.००	१५०.१९	(५०,२००.००)
१४३१२ प्रशासनिक दण्ड, जरिवाना र जफत	२,००,०००.००	१,७४,५४५.९८	८७.२७	२५,४५४.०२
१४६११ व्यवसाय कर	२०,००,०००.००	२५,४४,५५२.५०	१२७.२३	(५,४४,५५२.५०)
३२१२२ बैंक मौज्दात	३,७७,५४,६५०.३८	३,७५,९७,५२६.५९	९९.५८	१,५७,१२३.७९
जम्मा	६५,५५,६२,१६४.३८	६०,६९,५५,६६५.७२	९२.५८	४,८६,०६,४९८.६६

व्यय				
२२५११ कर्मचारी तालिम खर्च	१३,०४,३०७.००	१०,६९,६०१.००	८२.०१	२,३४,७०६.००
२२५१२ सीप विकास तथा जनचेतना तालिम तथा गोष्ठी सम्बन्धी खर्च	१३,३०,०००.००	३,२७,२९२.००	२४.६१	१०,०२,७०८.००
२२५२१ उत्पादन सामग्री / सेवा खर्च	९४,०००.००	९३,५२५.००	९९.४९	४७५.००
२२५२२ कार्यक्रम खर्च	९,७०,२५,८४१.००	७,२५,००,८७६.०२	७४.७२	२,४५,२४,९६४.९८
२२५२९ विविध कार्यक्रम खर्च	८९,८७,०५६.००	८०,८७,६४२.२५	८९.९९	८,९९,४१३.७५
२२६११ अनुगमन, मूल्यांकन खर्च	१४,४५,०००.००	१४,४०,५४५.००	९९.६९	४,४५५.००
२२६१२ भ्रमण खर्च	१७,५०,०००.००	१७,४३,७७०.२६	९९.६४	६,२२९.७४
२२७११ विविध खर्च	१,४८,४३,४८५.००	१,३४,६३,७२७.४५	९०.७	१३,७९,७५७.५५
२२७२१ सभा सञ्चालन खर्च	६,००,०००.००	६,००,०००.००	१००	०.००
२३१११ स्थिर सम्पत्तिमा ह्रास कट्टी	२३,९२,०००.००	२३,६५,५७१.००	९८.९	२६,४२९.००
२५२२२ वित्तीय व्यवसायहरूलाई पूँजीगत सहायता	२०,०००.००	२०,०००.००	१००	०.००
२५३१५ अन्य सस्था सहायता	१०,००,०००.००	८,७८,८५०.००	८७.८९	१,२१,१५०.००
२७१११ सामाजिक सुरक्षा	२०,००,०००.००	१५,२०,३३५.६५	७६.०२	४,७९,६६४.३५
२७११२ अन्य सामाजिक सुरक्षा	२,००,०००.००	०.००	०	२,००,०००.००
२७२१२ उद्दार, राहत तथा पुनर्स्थापना खर्च	४५,००,०००.००	१५,००,०००.००	३३.३३	३०,००,०००.००
२७२१३ औषधीखरिद खर्च	२५,८७,०००.००	२५,०१,३०२.००	९६.६९	८५,६९८.००
२८१४२ घरभाडा	५,००,०००.००	५,००,०००.००	१००	०.००
२८१४३ सवारी साधन तथा मेशिनर औजार भाडा	१२,००,०००.००	८,३५,८९२.००	६९.६६	३,६४,१०८.००
२८२१९ अन्य फिर्ता	७,६०,७१०.००	७,०३,५८६.००	९२.४९	५७,१२४.००
२८९११ भैपरी आउने चालु खर्च	५५,६४,६४९.००	०.००	०	५५,६४,६४९.००
पूंजीगत	२०,३७,९१,८०६.३८	१७,६३,०६,२२५.११	८६.५१	२,७४,८५,५८१.२७
३१११११ आवासीय भवन निर्माण/खरिद	१७,३१,०००.००	१५,६२,१०३.००	९०.२४	१,६८,८९७.००
३१११२ गैर आवासीय भवन निर्माण/खरिद	२,२५,१७,२००.००	१,९२,९९,७३२.२८	८५.७१	३२,१७,४६७.७२
३१११३ निर्मित भवनको संरचनात्मक सुधार खर्च	४०,३१,०००.००	३४,०१,६६२.८४	८४.३९	६,२९,३३७.१६
३११२१ सवारी साधन	५५,२२,९५६.३८	५५,१७,३५६.४४	९९.९	५,५९९.९४
३११२२ मेशिनरी तथा औजार	२४,००,०००.००	२३,४२,१३९.००	९७.५९	५७,८६१.००
३११२३ फर्निचर तथा फिक्चर्स	१८,००,०००.००	१७,६१,८०५.३५	९७.८८	३८,१९४.६५
३११३५ पूँजीगत परामर्श खर्च	१३,००,०००.००	१२,९५,४७९.००	९९.६५	४,५२१.००
३११५१ सडक तथा पूल निर्माण	८,७२,३८,९८०.००	७,६१,५०,७९७.५७	८७.२९	१,१०,८८,१८२.४३
३११५३ विद्युत संरचना निर्माण	२६,५०,०००.००	२६,०२,३५९.००	९८.२	४७,६४१.००

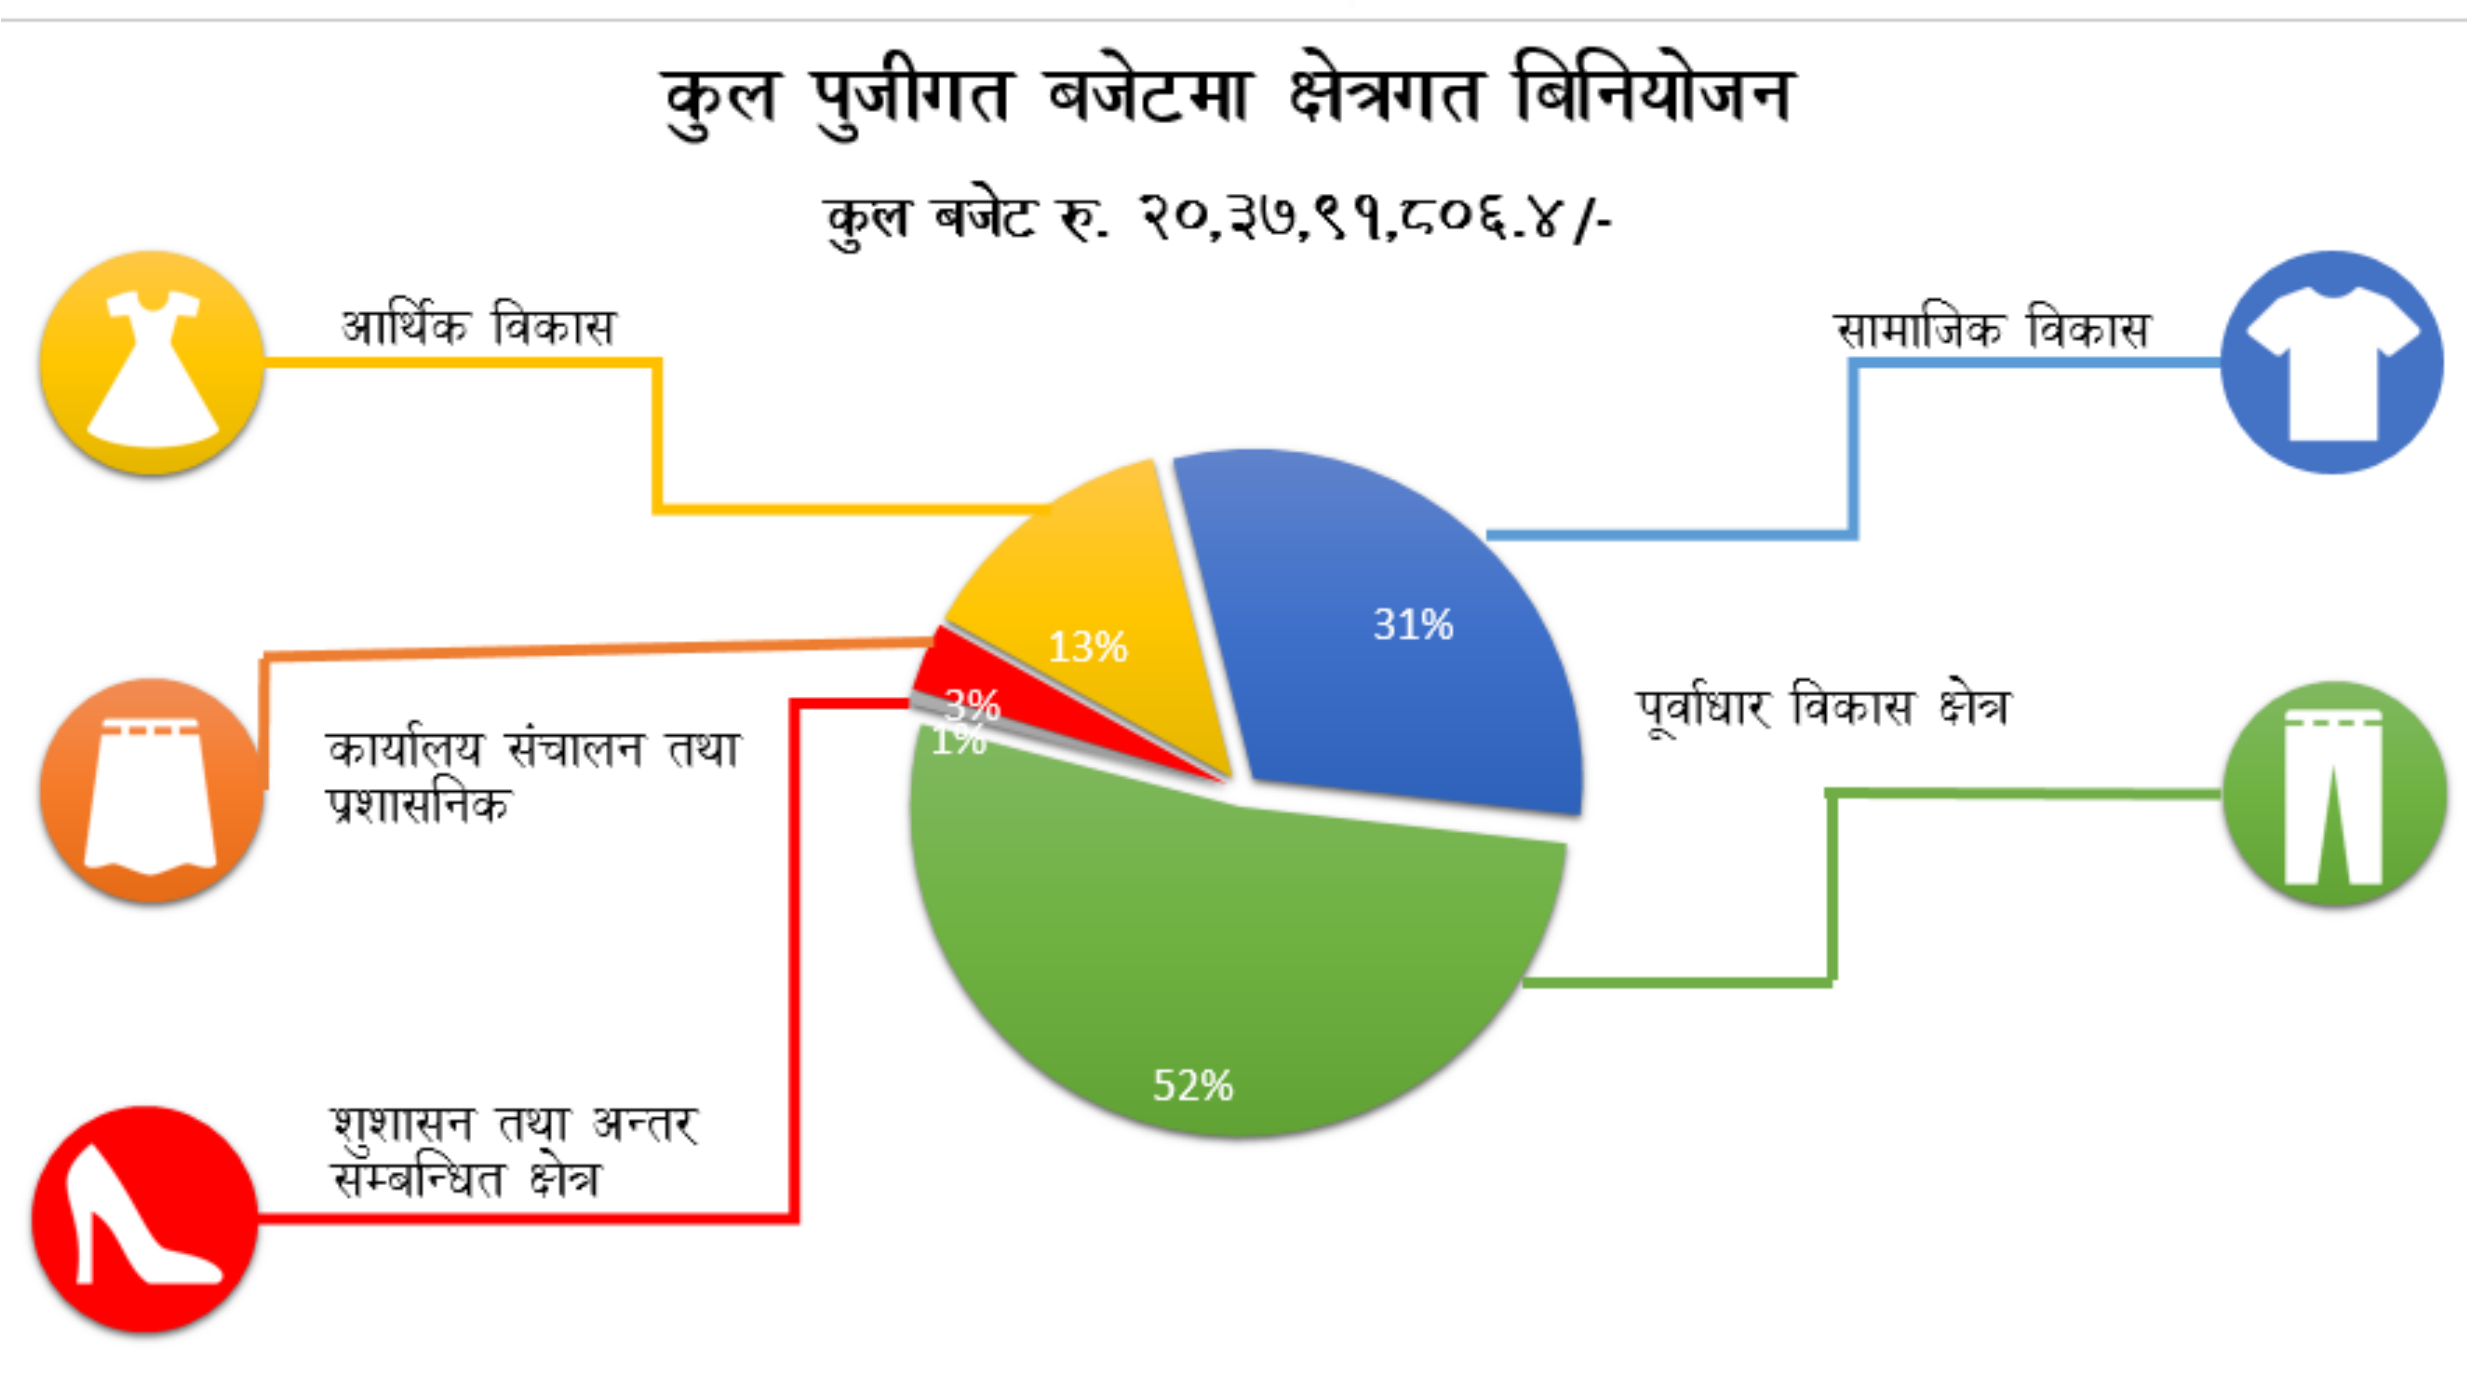

शिर्षकगत बिनियोजन

01

नगरपालिका पुजीगत

नगरपालिकाबाट संचालन हुने पुजीगत कार्यक्रमहरु रु. ३,०२,७०,८२६.३८ /-

02

जनतासंग मेयर/उपमेयर कार्यक्रम

जनतासंग मेयर/उपमेयर कार्यक्रम अन्तर्गतक कार्यक्रमहरु रु.४,२४,६००/-

03

प्रदेश समपुरक आयोजनाहरु

वार्ड नः १,२,६ र ७ मा संचालित प्रदेश समपुरक अनुदानको योजनाहरु रु. १,५०,०००,००/-

04

साझेदारी कार्यक्रम/म्याचिंग फण्ड

संघिय र प्रदेश समपुरक आयोजना र गै.स.स. संग साझेदारीको म्याचिंग फण्ड रु. ४,६१,७०,०००/-

शिर्षकगत बिनियोजन

05

वन,वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन

स्थानीय विपद व्यवस्थापको लागि विनियोजित रु. २,००,०००/-

06

वार्ड सिलिंग आयोजनाहरु

नगरपालिकाको सम्पूर्ण वार्डहरुमा संचालन हुने आयोजनाहरुको लागि रु. १,९३,४०,३८०/-

07

शिक्षा अन्तर्गत कार्यक्रमहरु

सिक्षा क्षेत्रमा हुने कार्यक्रमको लागि रु. ३,००,०००/-

08

संघिय शसर्त आयोजनाहरु

संघिय सरकारद्वारा शसर्त अनुदान मार्फत रु.२,३३,८६,०००/-

शिर्षकगत बिनियोजन

09

संघिय विशेष अनुदान

संघिय विशेष अनुदान अन्तर्गत कार्यक्रमको लागि रु.२,७०,००,०००/-

10

संघिय समपुरक अनुदान

संघिय समपुरक आयोजनामा विनियोजित रु. २,२५,०००,००/-

11

प्रदेश शसर्त अनुदान

प्रदेश शसर्त आयोजनामा विनियोजित रकम रु. १,३७,०००,००/-

12

प्रदेश विशेष अनुदान

प्रदेश विशेष अनुदान मार्फत विनियोजित रकम रु. ५५,०००,००/-

3 आयोजनाको प्रगति (वित्तीय/भौतिक)

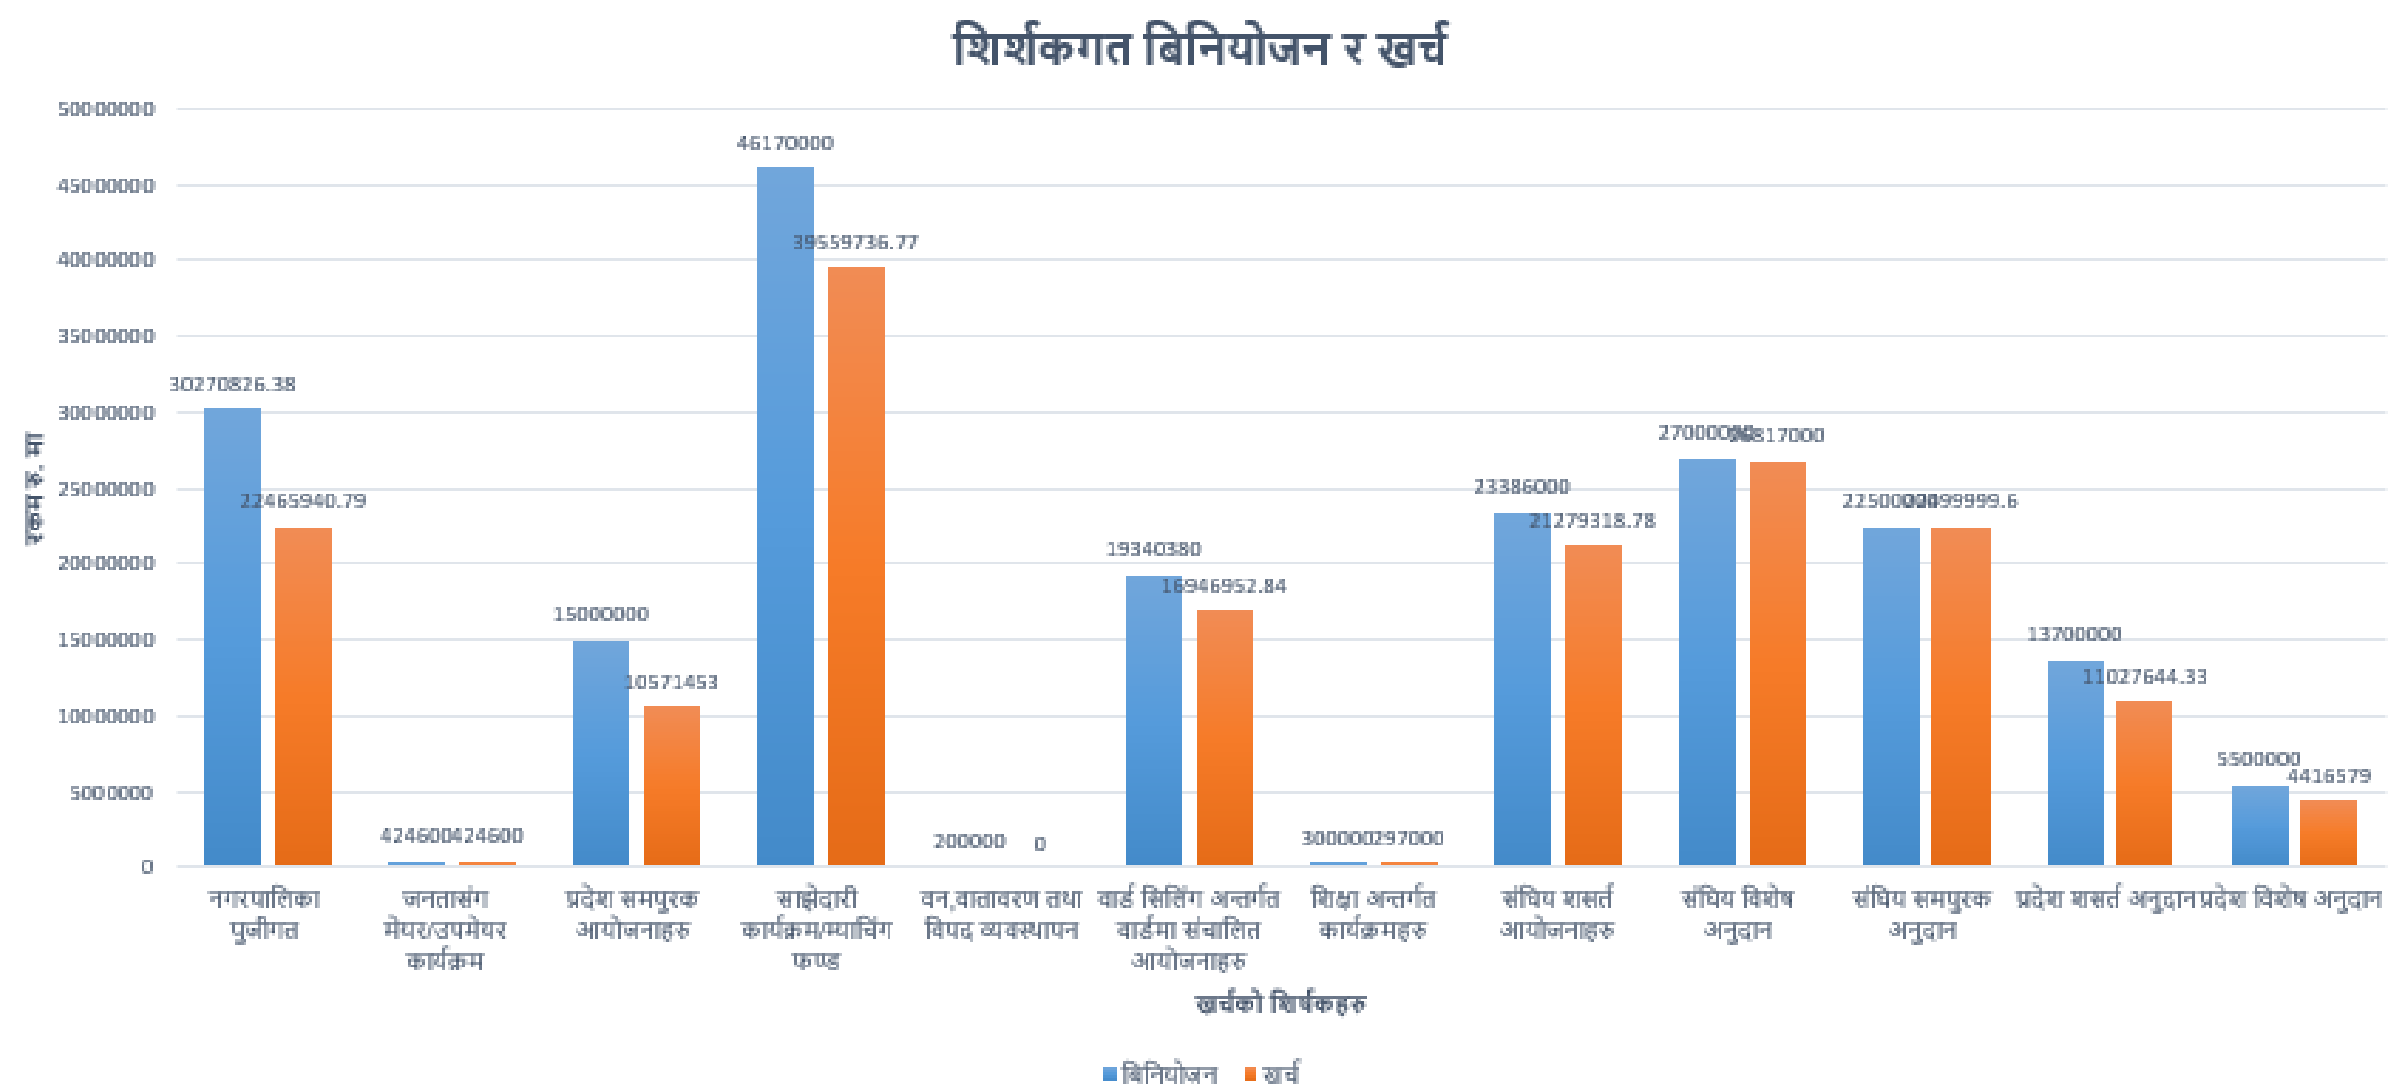

3 आयोजनाको प्रगति (वित्तीय/भौतिक)

औसत खर्चको प्रतिशत = ८६.५१ %

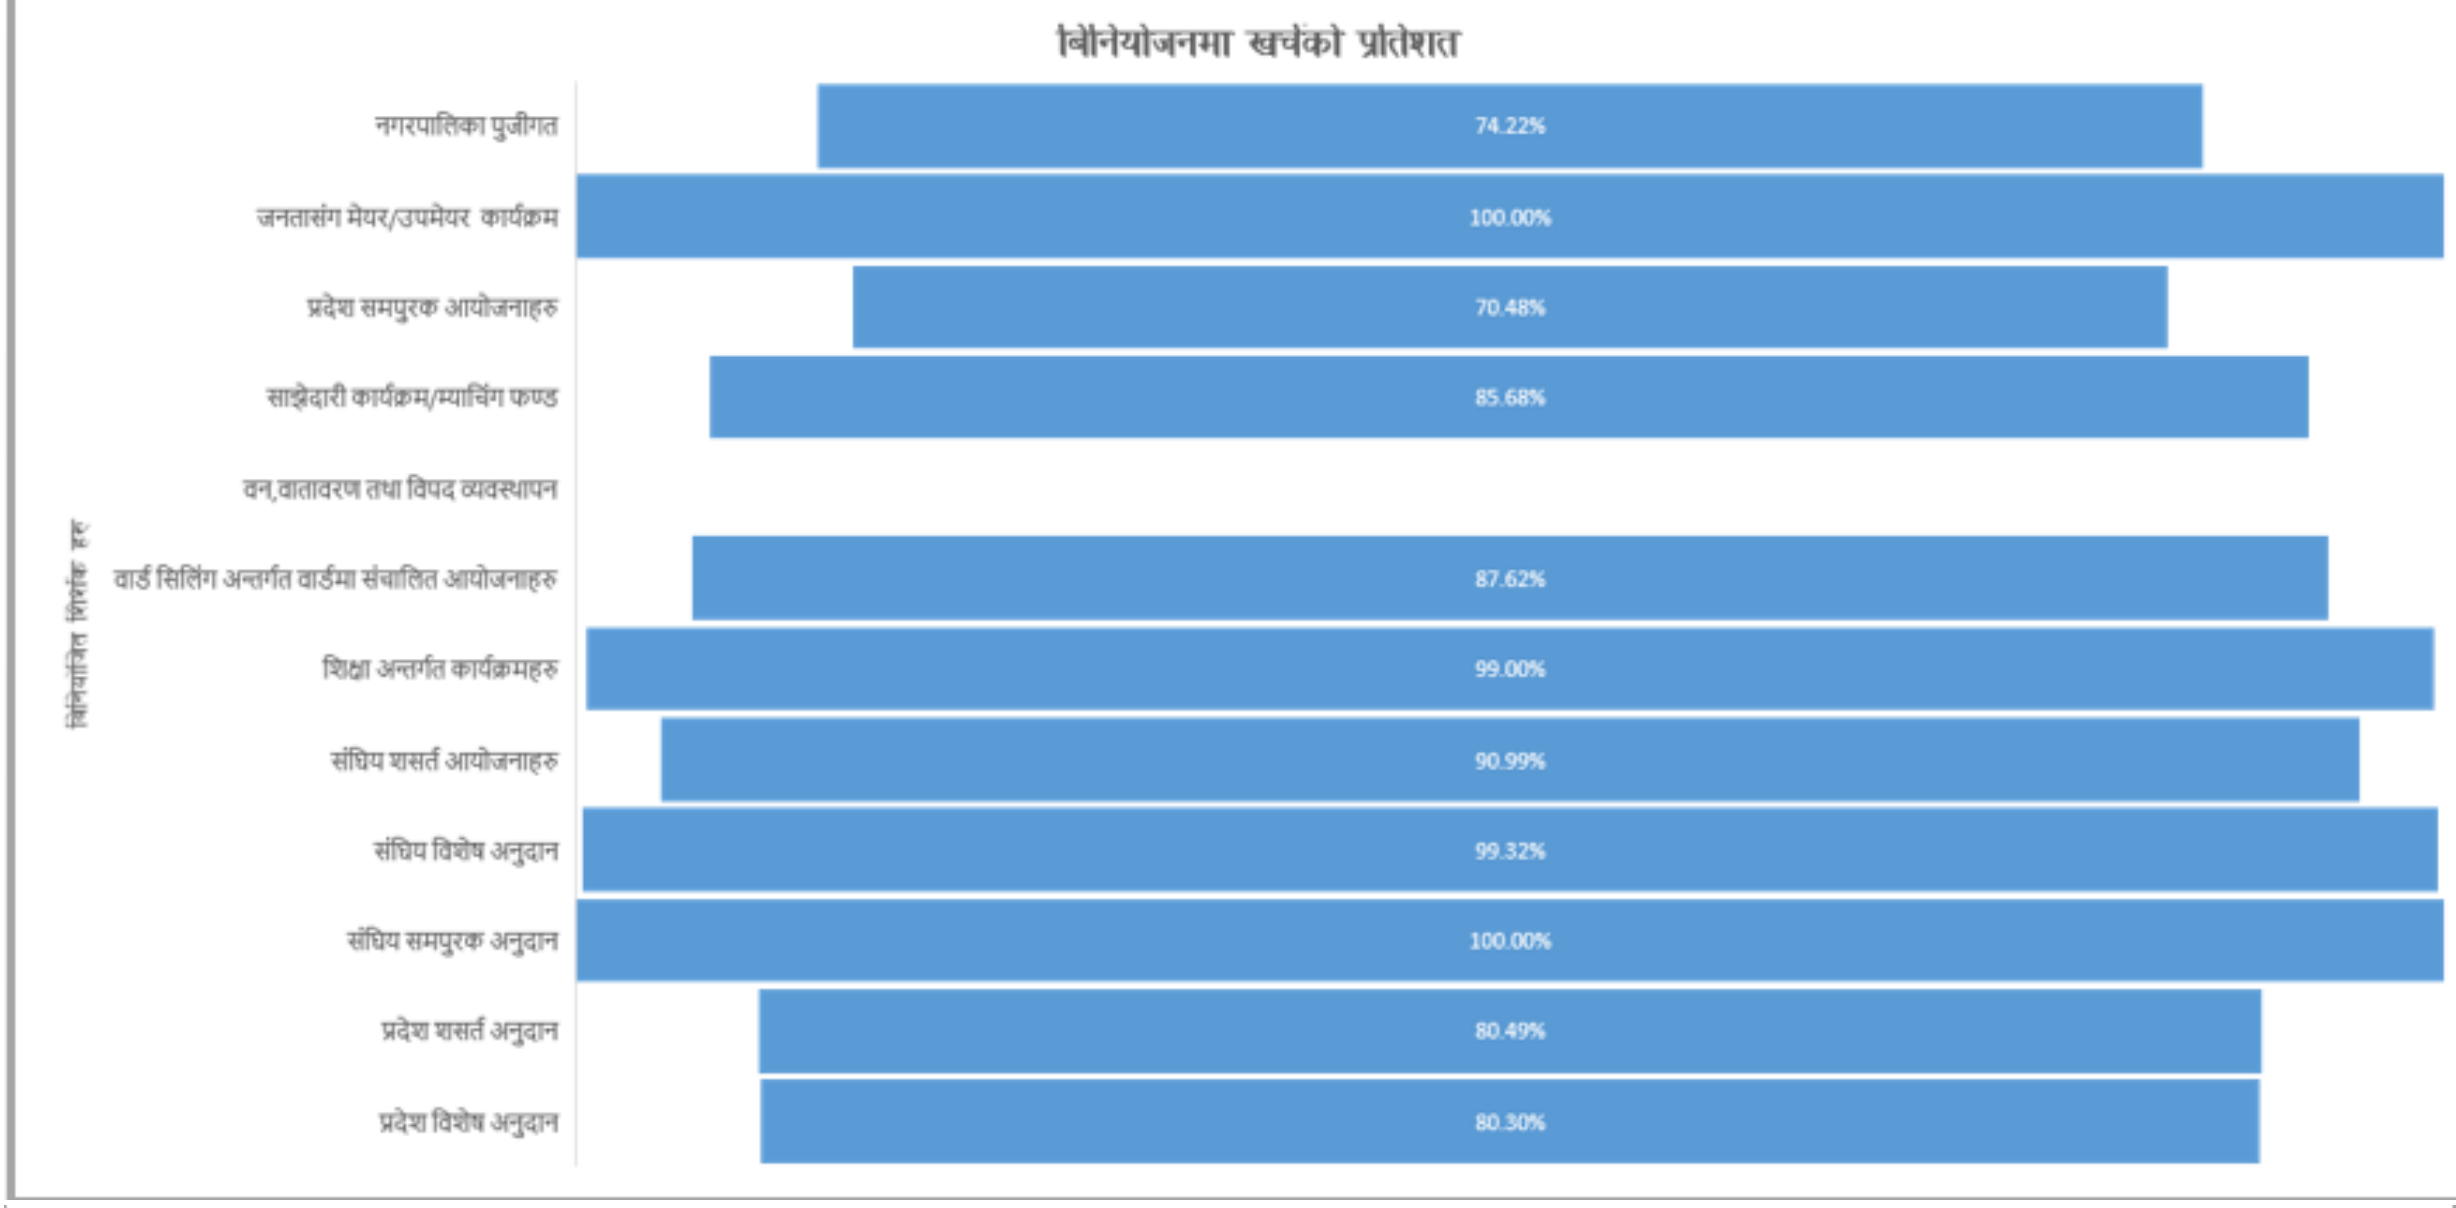

3 आयोजनाको प्रगति (वित्तीय/भौतिक

कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	स्रोत	विनियोजन	खर्च	खर्च (%)	मौज्दात
८०५५५४०२१०१ स्वर्गद्वारी नगरपालिका					
सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम	आन्तरिक श्रोत	१३,५०,०००.००	११,९२,५३३.००	८८.३४	१,५७,४६७.००
सुचना प्रविधि मल्टीपर्पोज हल समपुरकको गत बर्षको ठेक्काको म्याद थपको भुक्तानी	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	२२,९१,२००.००	११,५४,७००.००	५०.४०	११,३६,५००.००
चमेनागृह पार्कीङ तथा बाउन्डरी निर्माण	नेपाल सरकार - समानिकरण	२०,००,०००.००	१६,१६,१९४.००	८०.८१	३,८३,८०६.००
भवन भर्मत संभार	नेपाल सरकार - समानिकरण	५,००,०००.००	३,०१,९२७.००	६०.३९	१,९८,०७३.००
जेसिवी खरिद	नेपाल सरकार - समानिकरण	४७,००,०००.००	४७,००,०००.००	१००.००	०.००
जेसिवी खरिद	आन्तरिक श्रोत	६,९०,०००.००	६,८५,०००.००	९९.२८	५,०००.००
एम्बुलेन्स	आन्तरिक श्रोत	१,३२,९५६.३८	१,३२,३५६.४४	९९.५५	५९९.९४
इलाका प्रहरी कार्यालय भिङ्ग्री सिसि क्यामेरा जडान	आन्तरिक श्रोत	४,००,०००.००	३,९७,२५७.००	९९.३१	२,७४३.००
मेशिनरी तथा अोजार खरिद	आन्तरिक श्रोत	१७,००,०००.००	१६,४५,८८२.००	९६.८२	५४,११८.००
सभाहल व्यवस्थापन	लुम्बिनी प्रदेश - समानिकरण अनुदान	२,८५,२८६.००	२,८२,२८६.००	९८.९५	३,०००.००
सभाहल व्यवस्थापन	राजस्व बाँडफाँड - प्रदेश सरकार	५,१४,७१४.००	४,९१,८७७.००	९५.५६	२२,८३७.००
न्यायीक समितीको इजलास कक्ष निर्माण	आन्तरिक श्रोत	३,००,०००.००	२,९९,९०२.००	९९.९७	९८.००
फर्निचर तथा फिक्चर्च फर्निङ	राजस्व बाँडफाँड - प्रदेश सरकार	७,००,०००.००	६,८७,७४०.३५	९८.२५	१२,२५९.६५
आवधिक योजना निर्माण	आन्तरिक श्रोत	१३,००,०००.००	१२,९५,४७९.००	९९.६५	४,५२१.००
अधुरा सडक पुर्णता	आन्तरिक श्रोत	४५,००,०००.००	३४,०६,०४७.००	७५.६९	१०,९३,९५३.००

3 आयोजनाको प्रगति (वित्तीय/भौतिक

कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	स्रोत	विनियोजन	खर्च	खर्च (%)	मौज्दात
८०५५५४०२१०१ स्वर्गद्वारी नगरपालिका					
भिङ्ग्रि बजारकाे ढल निकास तथा नाला	राजस्व बाँडफाँड - संघीय सरकार	९५,०००.००	०.००	०.००	९५,०००.००
ब्याकहोलोडरकाे इन्धन	राजस्व बाँडफाँड - संघीय सरकार	९,२४,६००.००	९,२४,६००.००	१००.००	०.००
ब्याकहोलोडरकाे इन्धन	लुम्बिनी प्रदेश - समानिकरण अनुदान	१०,७५,४००.००	२,०८,८१२.००	१९.४२	८,६६,५८८.००
चकचके रोल्पा सडक खण्डको लामाचौर देखि दोमही सम्मको सड्क लगत कट्टा	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	४,००,०००.००	०.००	०.००	४,००,०००.००
धनबाङ खोला बाटो मर्मत	राजस्व बाँडफाँड - संघीय सरकार	३,००,०००.००	०.००	०.००	३,००,०००.००
सिचाइ	आन्तरिक श्रोत	१८,००,०००.००	०.००	०.००	१८,००,०००.००
खानेपानी	आन्तरिक श्रोत	१०,००,०००.००	५,४७,३६६.००	५४.७४	४,५२,६३४.००
नगरपालिका घेराबार	आन्तरिक श्रोत	२,८०,०००.००	२,६१,००४.००	९३.२२	१८,९९६.००
सहिद परिवार सम्मान तथा सहिद गेट मर्मत	आन्तरिक श्रोत	३०,०००.००	०.००	०.००	३०,०००.००
सहिद परिवार सम्मान तथा सहिद गेट मर्मत	नेपाल सरकार - समानिकरण	२,७०,०००.००	१,४९,९९९.००	५५.५६	१,२०,००१.००
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भिंग्रीको X-REY कोठा मर्मत	राजस्व बाँडफाँड - संघीय सरकार	३,५०,०००.००	३,४४,९०५.००	९८.५४	५,०९५.००
चैते खोला बाढी सफाई योजना	नेपाल सरकार - समानिकरण	८१,६७०.००	८१,६७०.००	१००.००	०.००
कृषि तथा खसी हाटबजार व्यवस्थापन	लुम्बिनी प्रदेश - समानिकरण अनुदान	३,००,०००.००	२,७५,८८०.००	९१.९६	२४,१२०.००
परामर्स सेवा	नेपाल सरकार - समानिकरण	२०,००,०००.००	१३,८२,५२४.००	६९.१३	६,१७,४७६.००

कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	स्रोत	विनियोजन	खर्च	खर्च (%)	मौज्दात
८०५५५४०२१०१ स्वर्गद्वारी नगरपालिका					
८०५५५४०२१०४ स्वर्गद्वारी नगरपालिका-जनतासँग मेयर उपमेयर					
जनता सँग मेयर	लुम्बिनी प्रदेश - समानिकरण अनुदान	४,२४,६००.००	४,२४,६००.००	१००.००	०.००
८०५५५४०२१०५ स्वर्गद्वारी नगरपालिका-महिलासँग उपप्रमुख					
उपमेयर कोशेली एम्बुलेन्स सहायता	लुम्बिनी प्रदेश - समानिकरण अनुदान	०.००	०.००	०.००	०.००

3 आयोजनाको प्रगति (वित्तीय/भौतिक)

स्वर्गद्वारी नगरपालेका

जेसिबी खरिद कार्य

नगरपालिकाको सभा हल व्यवस्थापन

नगरपालिका चमेना घर निर्माण

नगरपालिका आवधिक योजना निर्माण

3 आयोजनाको प्रगति (वित्तीय/भौतिक)

जनतासंग मेयर कार्यक्रममा साझेदारी

बोझपोखरा पोखरी निर्माण आयोजना स्व.न पा-०९(गोल-२/नगरपालिका र मेयर कार्यक्रम)

3 आयोजनाको प्रगति (वित्तीय/भौतिक)

प्रदेश समपुरक अनुदान कार्यक्रम

धरमपानिदेखी अरंगखोला सम्म जोड्ने बाटो स्तारुन्नती

भिंग्री,धनवांग स्वर्गद्वारी सडक स्तारुन्नती

भालुखोला तापकोट सिख्रे सिंचाई आयोजना

दंगाल्खोला बेलबास ३/४ सिंचाई आयोजना

3 आयोजनाको प्रगति (वित्तीय/भौतिक)

नगरपालिका म्याचिंग फण्ड कार्यक्रम

शान्तिपार्क निर्माण आयोजना स्व.न.पा.-०८,बर्जिवांग	धरमशाला अमर मा.वि. देखि मलुंग जोड्ने बाटो
सुधारिएको खोर निर्माण –गोल साझेदारी	डिपिंग ट्यांकी निर्माण आयोजना,स्व.न.पा-०२,जोगीमारा

3 आयोजनाको प्रगति (वित्तीय/भौतिक)

संघिय शसर्त

जारिखोला झोलुंगे पुल निर्माण आयोजना	अमर मा.वि. नमुना विद्यालय निर्माण आयोजना

सारी स्वास्थ्य चौकी निर्माण आयोजना

3 आयोजनाको प्रगति (वित्तीय/भौतिक)

संघिय विशेष अनुदान

बाँझिपुर लिफ्ट सिंचाई आयोजना,स्व.न.पा.-०४ र देउराली सलाबांग थापखार्क निंगला छहरेखोला खा.पा स्व.न. पा-०६	

3 आयोजनाको प्रगति (वित्तीय/भौतिक)

संघिय समपुरक अनुदान

धर्मशाला अमर मा.वि. मालुंग बाटो	नगरपालिका देखि जिमुरपाटासम्म जोड्ने बाटो

3 आयोजनाको प्रगति (वित्तीय/भौतिक)

प्रदेश शसर्त अनुदान

अमर क्याम्पस पर्खाल निर्माण आयोजना,स्व.न.पा-०४

श्री बाल संस्कृत मा.वि. शौचालय निर्माण स्व.न.पा -०२

श्री जन प्राणी प्रा.वि. शौचालय निर्माण ,स्व.न.पा-०१

श्री झूपाकोट प्रा.वि.,स्व.न.पा-०६

3 आयोजनाको प्रगति (वित्तीय/भौतिक)

प्रदेश विशेष अनुदान

खोप केन्द्र निर्माण स्व.न.पा.-०४

सिध्देस्वोरी आ.वि. निर्माण स्व.न.पा-०३

भुवनेस्वरी प्रा.वि. भवन निर्माण,स्व.न.पा-०२

नुनेपानी मूल संरक्षण तथा घुस्तुंग एक घर एक धारा

3 आयोजनाको प्रगति (वित्तीय/भौतिक

वार्ड सिलिंग अन्तर्गत बिनियोजन/खर्च

सी.न.	वार्ड स्तरीय आयोजनाहरु	बिनियोजन	खर्च	खर्च प्रतिशत	कैफियत
१	वार्ड नम्बर १	1650000	1634464	99.06%	
२	वार्ड नम्बर २	1835380	1767294	96.29%	
३	वार्ड नम्बर ३	2290000	2205150	96.29%	
४	वार्ड नम्बर ४	1850000	1761906.84	95.24%	
५	वार्ड नम्बर ५	2240000	2177604	97.21%	
६	वार्ड नम्बर ६	1700000	1645856	96.82%	
७	वार्ड नम्बर ७	3315000	1579793	47.66%	
८	वार्ड नम्बर ८	1900000	1847849	97.26%	
९	वार्ड नम्बर ९	2560000	2327036	90.90%	
जम्मा जम्मी		**19340380**	**16946952.84**	**87.62%**	

3 आयोजनाको प्रगति (वित्तीय/भौतिक

वार्ड सिलिंग अन्तर्गत बिनियोजन/खर्च

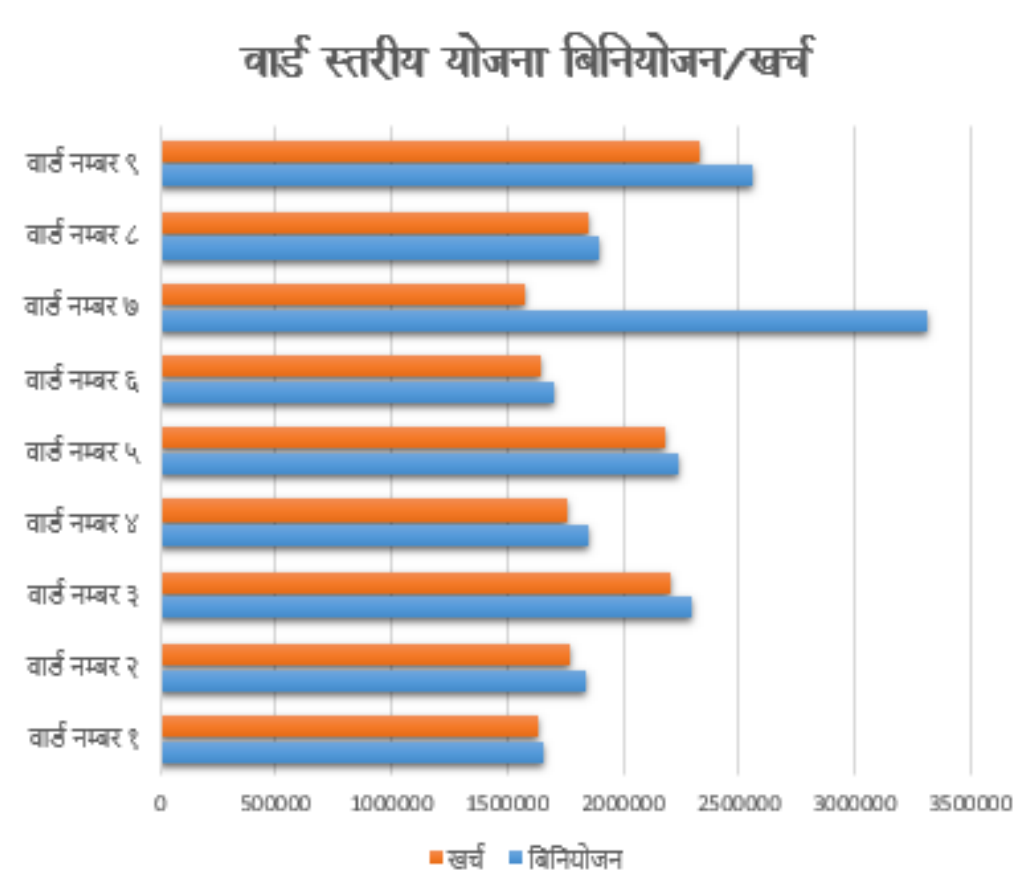

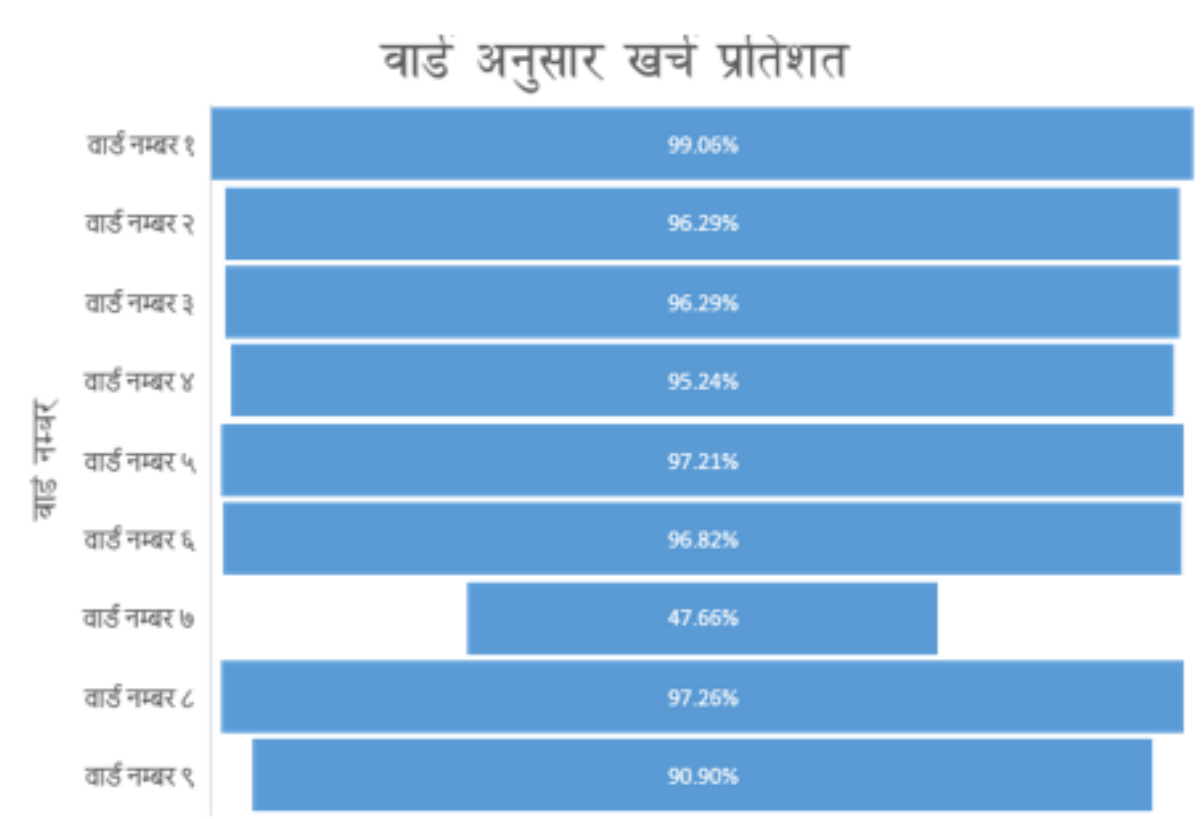

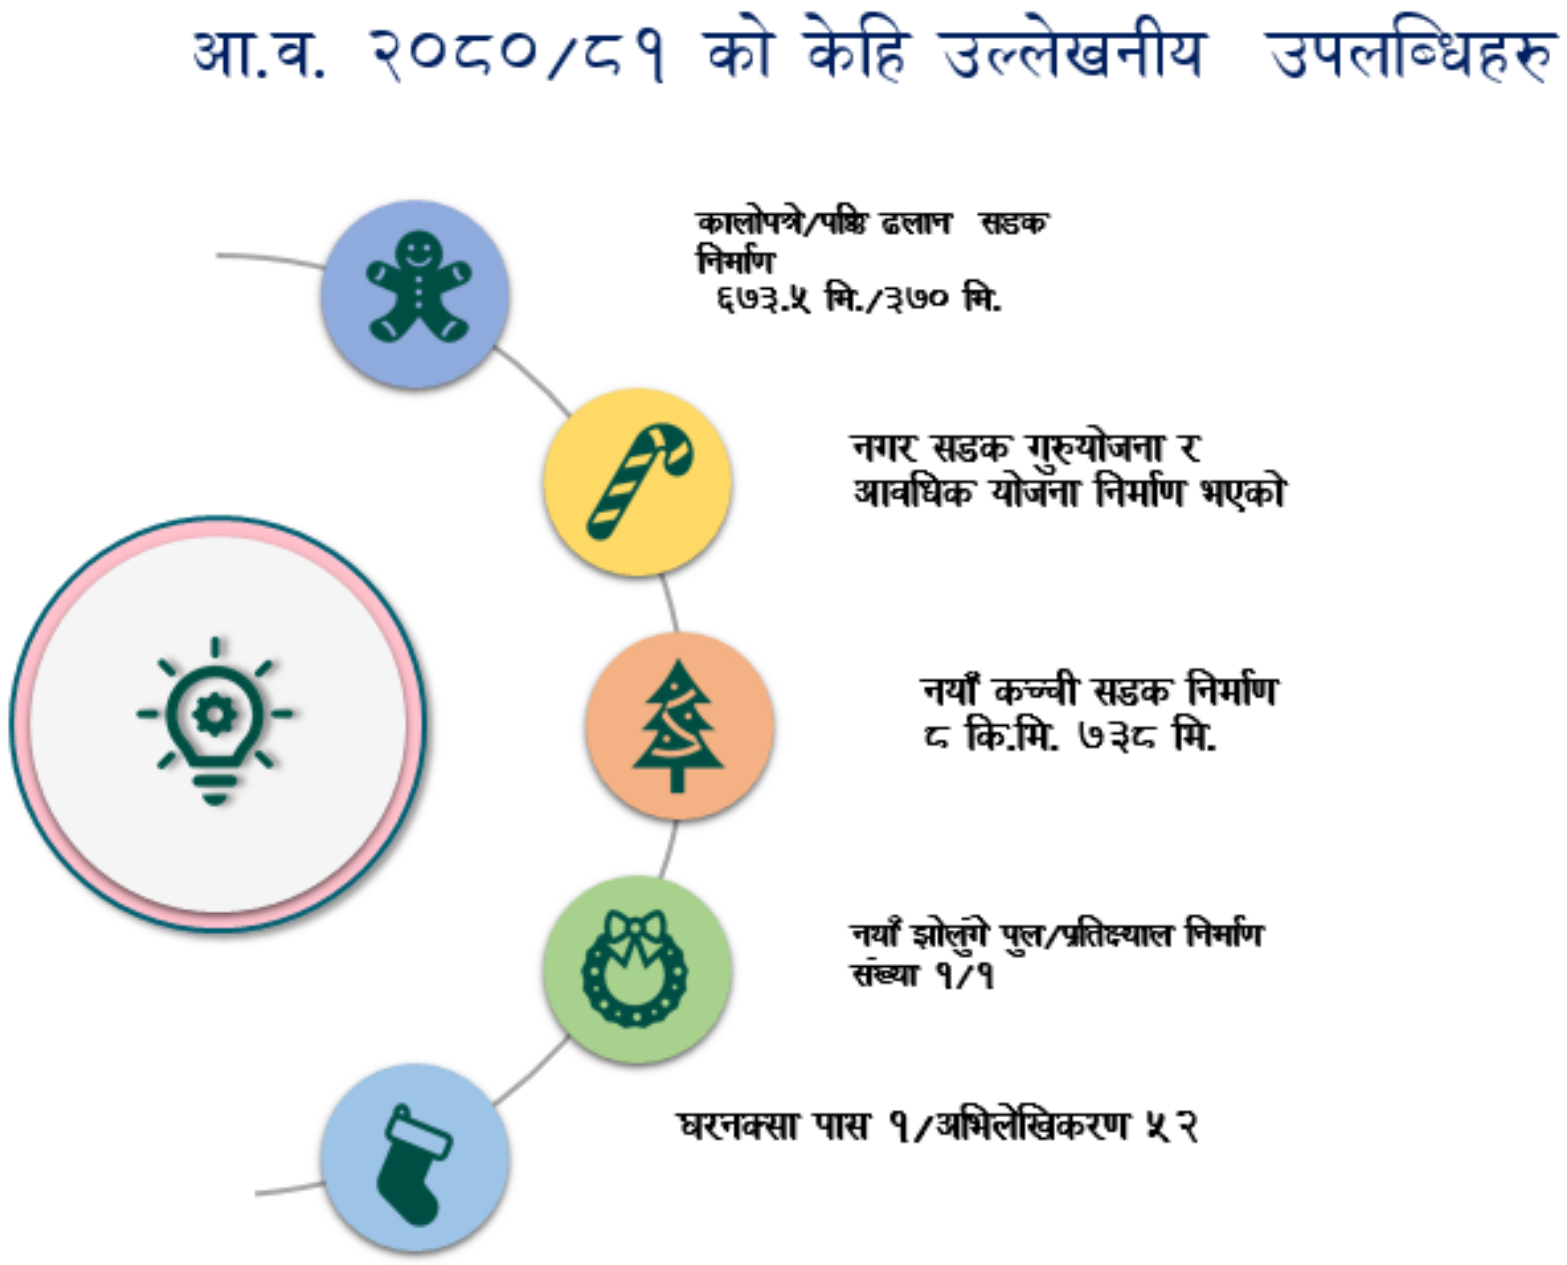

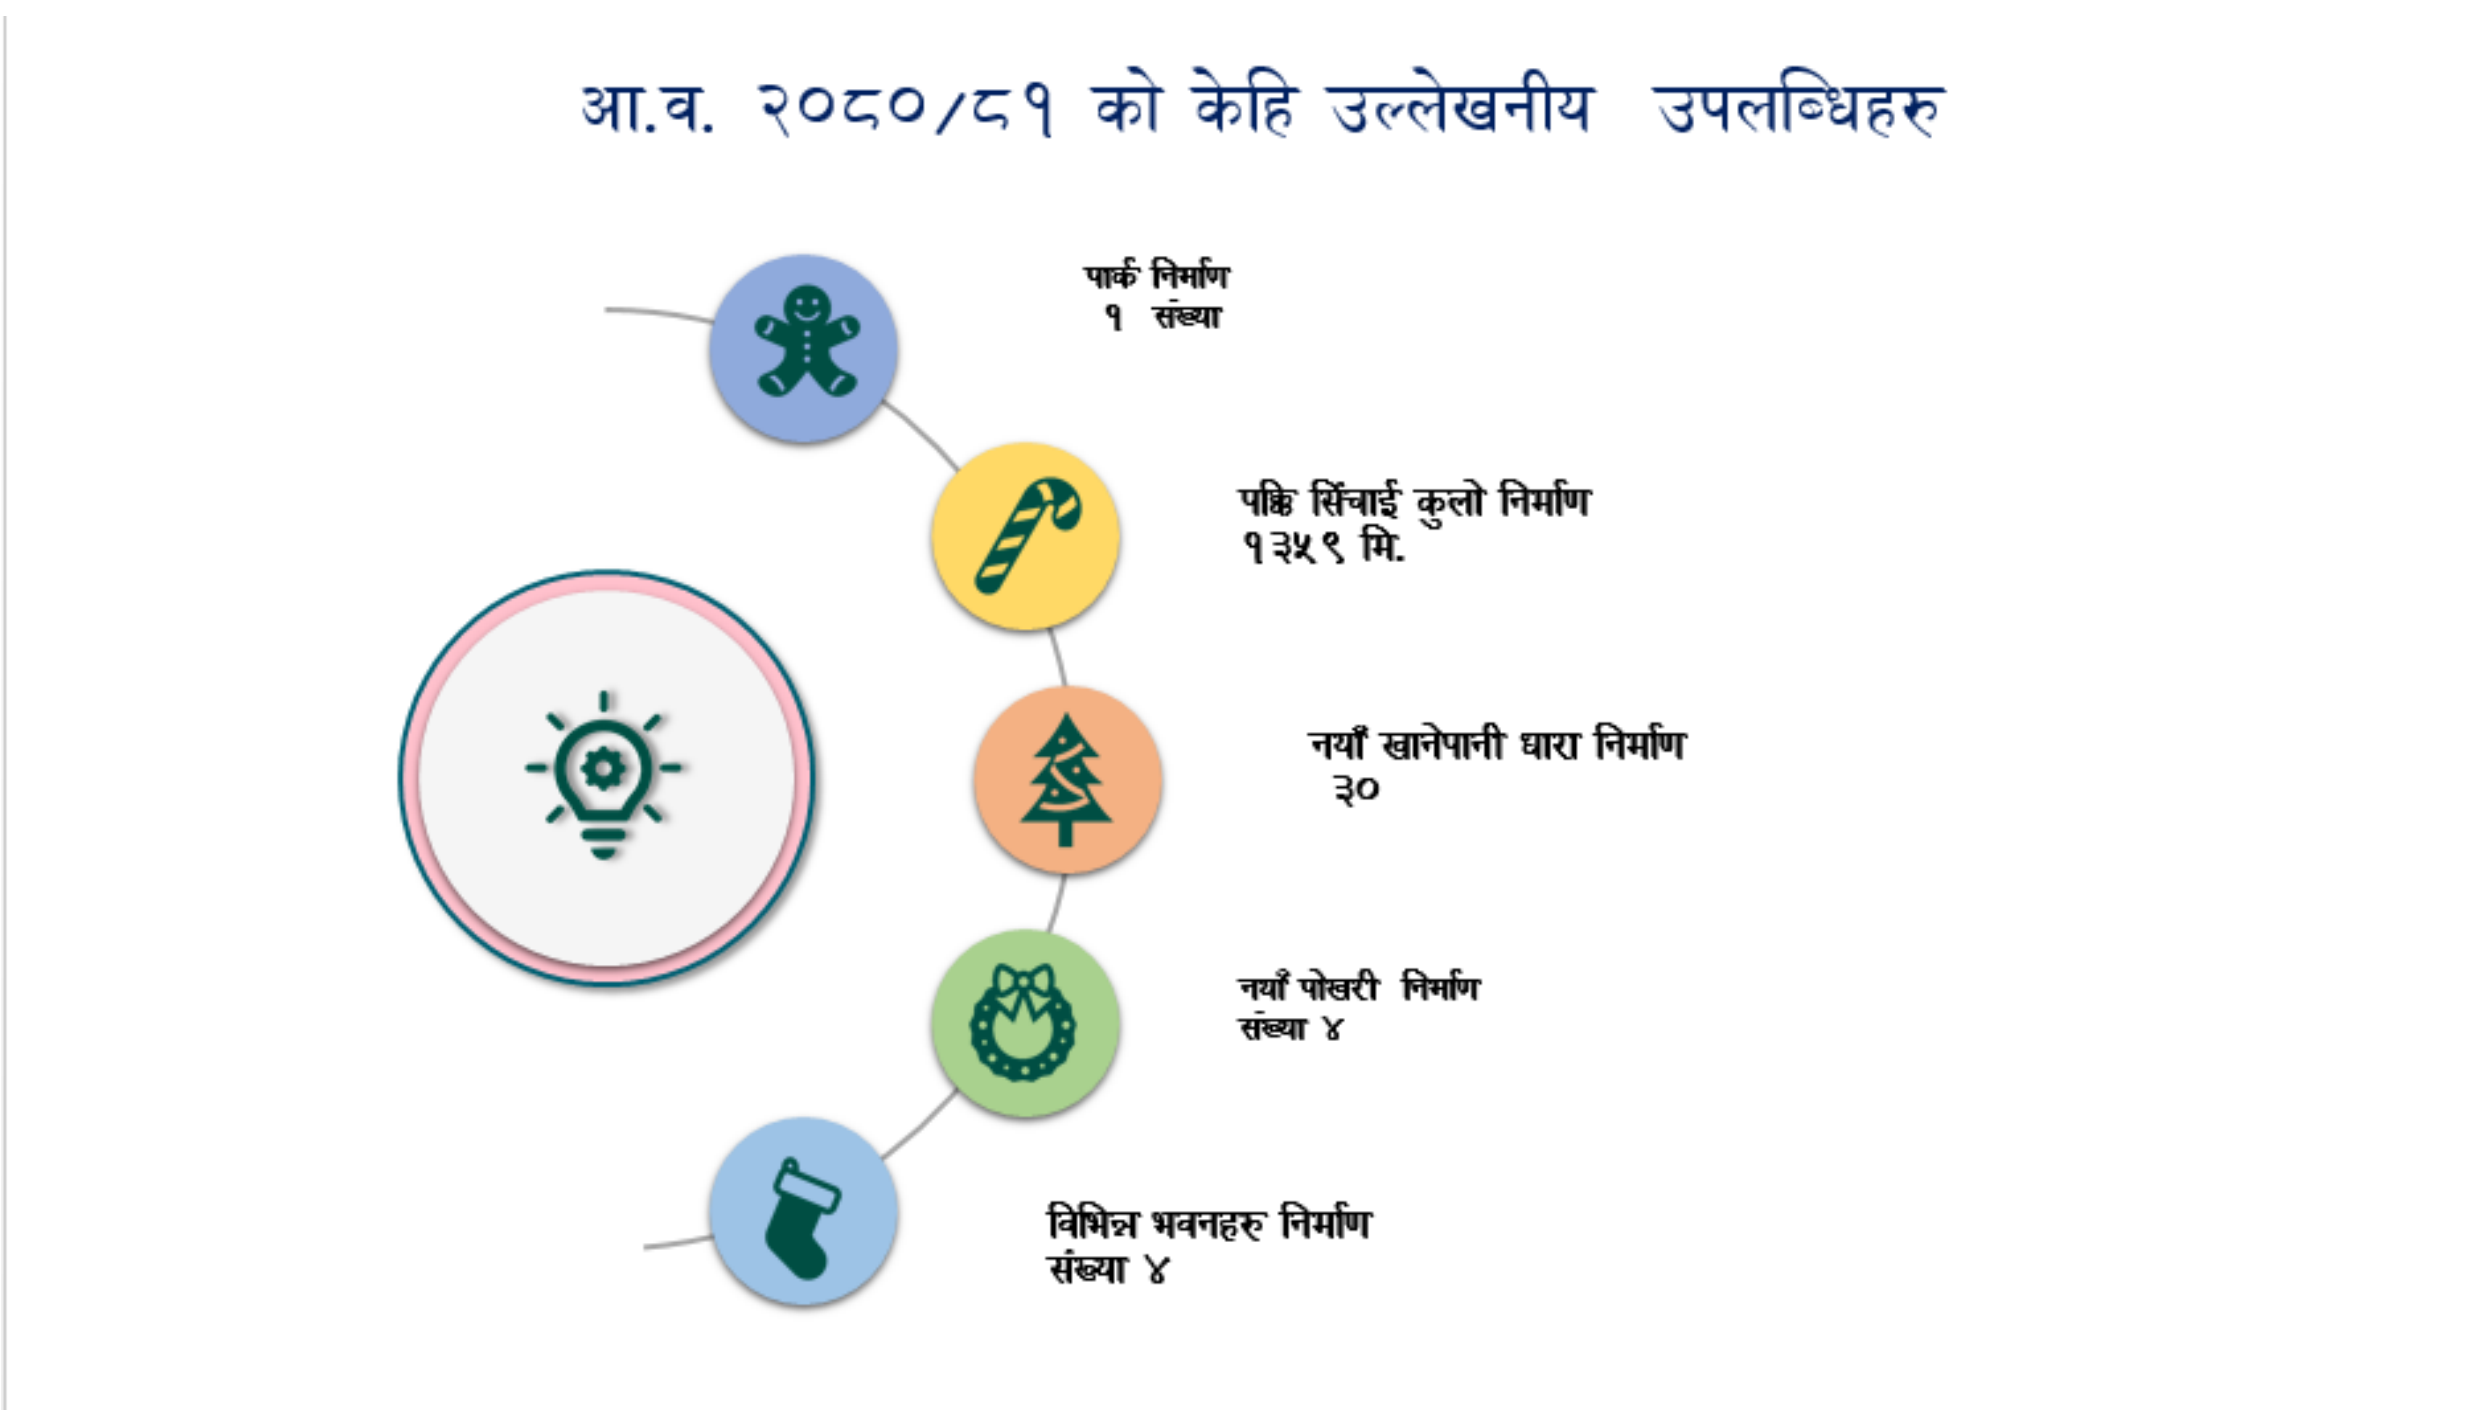

न्यायिक समिति तर्फ

१ कुल निबेदन संख्या ५४

२ फछ्र्यौट निबेदन संख्या १०

३ जिल्ला सिफारिस गरिएका संख्या ५

प्रमुख उपलब्धिहरु

- परीक्षाको नतिजा २०८० चैत्रको २४ गते प्रकाशन गरिएको ।
- यस परीक्षामा नगरपालिकाको सर्वोत्कृष्ट विद्यार्थी लोकचतना एकेडेमी भिँगृका .... भएका छन् ।
- कुल विद्यार्थी संख्याको ११.९२ प्रतिशत विद्यार्थी मात्र उत्तिर्ण भएको ।
- सामुदायिक विद्यालय तर्फ जम्मा ७१ जना विद्यार्थीहरु मध्ये १४ जना विद्यार्थी उत्तिर्ण गराइ (१९.७१ प्रतिशत) विद्यार्थी उत्तिर्ण गराई अमर माध्यमिक विद्यालय भिँगृ **प्रथम** भएको ।
- सस्थागत विद्यालय तर्फ दर्पण विद्यासदनले ६२.५ प्रतिशत विद्यार्थी उत्तिर्ण गराई नगरपालिकाकै **सर्वोत्कृष्ट** नतिजा निकालेको छ ।
- गुरुकुलमतर्फ वाल तपश्वी वेद विद्यालय गुरुकुलमवाट जम्मा ५ जना विद्यार्थीहरुमध्ये ३ जना (६० प्रतिशत) विद्यार्थी उत्तिर्ण भएको ।
- १९ वटा विद्यालयमध्ये वाल संस्कृत मावि धरमपानी, विद्यानन्द मावि जुडापाटा, शिशुकल्याण आ वि दहचौर, ने रा आवि स्यानिलेख, शिद्धेश्वरी आवि नेवारे गरी जम्मा ५ वटा विद्यालय को नतिजा शुन्य रहेको ।
- संस्थागत विद्यालयहरु भन्दा सामुदायिक विद्यालयहरुको नतिजा कमजोर देखिएको ।
- तुलनात्मक रुपमा हेर्दा अन्य विषयहरु भन्दा अँग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयमा कमजोर रहेको देखिन्छ ।
- यसरी हेर्दा समग्र नगरपालिकाको नतिजा उपलब्धी स्तर अत्यन्त न्यून देखिन्छ ।

कुन विषयमा कति जना विद्यार्थी कुन ग्रेडमा उत्तिर्ण ?

S.N	Subjects	A+	A	B+	B	C+	C	D	NG
1	Nepali	0	13	30	52	71	163	131	241
2	English	0	1	12	34	54	97	103	400
3	Mathematics	1	7	16	35	37	62	89	454
4	Science & Technology	4	4	11	29	43	78	84	448
5	Social Studies & Human Value Education	0	7	16	31	62	127	108	350
6	Health Physical & Creative Art	6	21	35	44	76	127	98	294
7	Computer Science	5	24	39	38	54	99	70	372
8	Nepali	0	0	1	2	1	1	0	0
9	English	0	0	0	0	2	2	1	0
10	Mathematics	0	0	1	0	2	1	1	0
11	Sanskrit Byakaran	0	0	0	3	0	1	1	0
12	Karmakanda	0	0	1	3	0	1	0	0
13	Sanskrit Bhasha	1	2	0	0	1	1	0	0
14	Shuklayajurveda	0	2	2	0	0	1	0	0

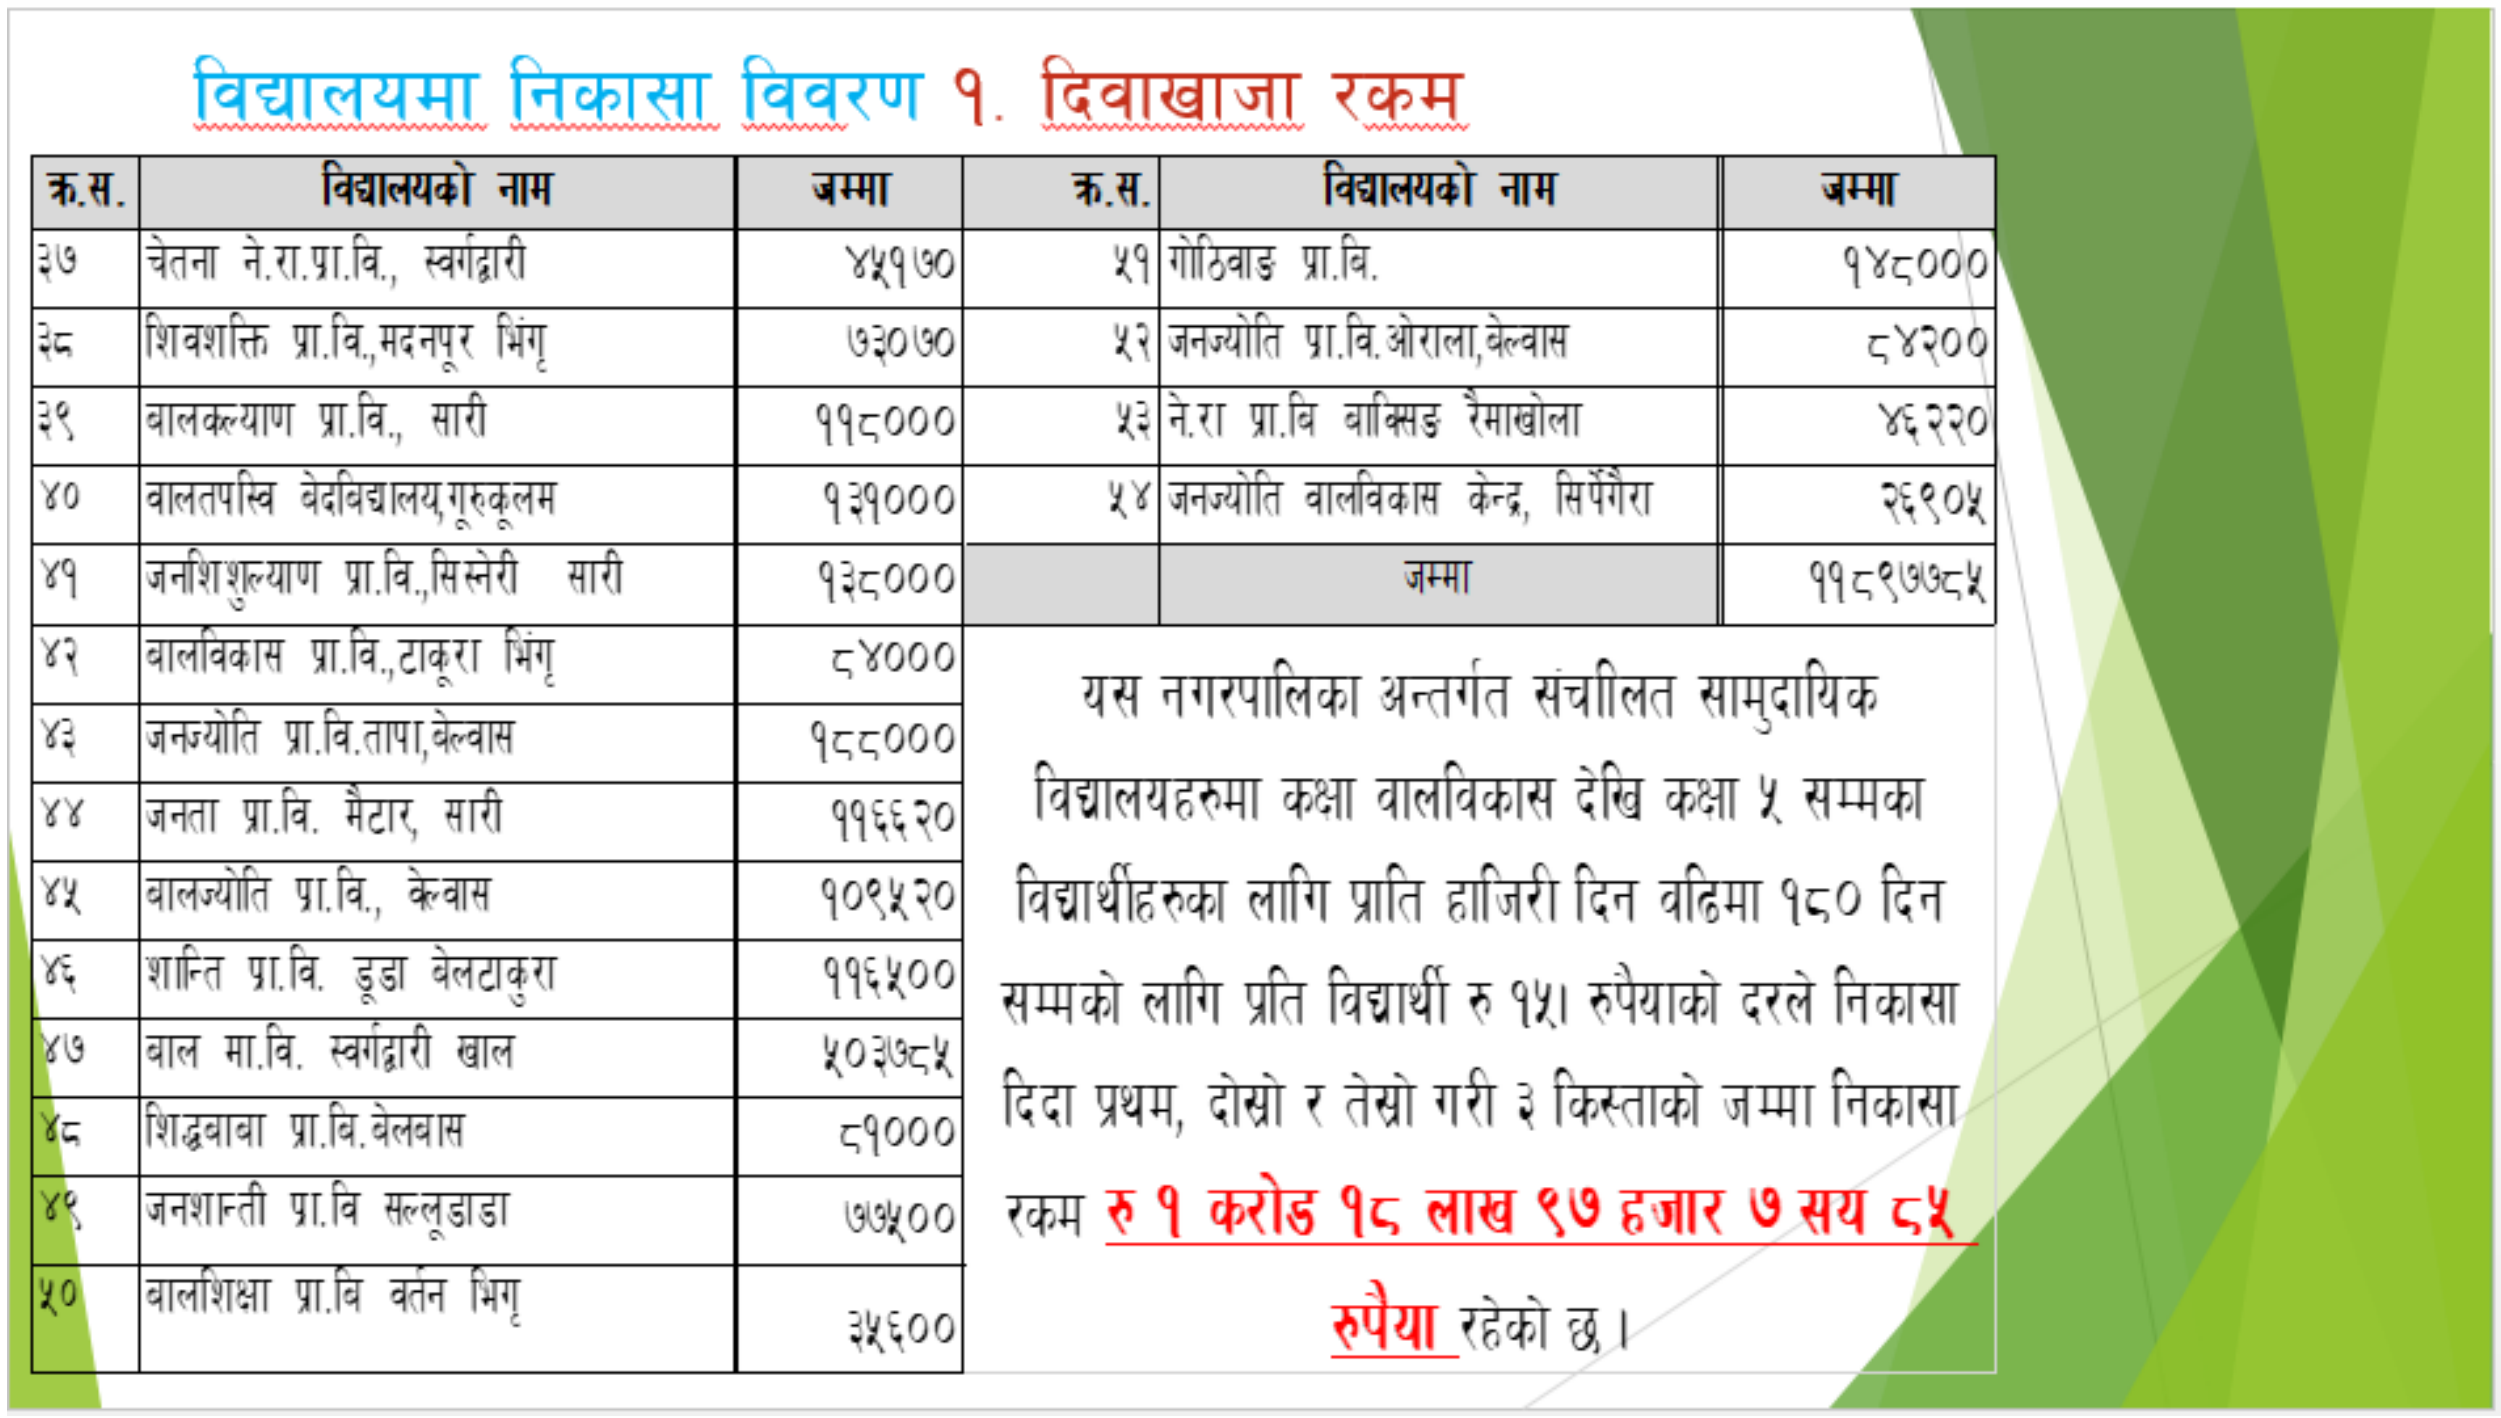

विद्यालयमा निकासा विवरण १. दिवाखाजा रकम

क्र.स.	विद्यालयको नाम	जम्मा	क्र.स.	विद्यालयको नाम	जम्मा
३७	चेतना ने.रा.प्रा.वि., स्वर्गद्वारी	४५१७०	५१	गोठिवाङ प्रा.वि.	१४८०००
३८	शिवशक्ति प्रा.वि.,मदनपूर भिंगृ	७३०७०	५२	जनज्योति प्रा.वि.ओराला,बेल्वास	८४२००
३९	बालकल्याण प्रा.वि., सारी	११८०००	५३	ने.रा प्रा.बि बाक्सिङ रैमाखोला	४६२२०
४०	वालतपस्वि बेदविद्यालय,गूरुकूलम	१३१०००	५४	जनज्योति वालविकास केन्द्र, सिर्पेगैरा	२६९०५
४१	जनशिशुल्याण प्रा.वि.,सिस्नेरी सारी	१३८०००		जम्मा	११८९७७८५
४२	बालविकास प्रा.वि.,टाकूरा भिंगृ	८४०००			
४३	जनज्योति प्रा.वि.तापा,बेल्वास	१८८०००			
४४	जनता प्रा.वि. मैटार, सारी	११६६२०			
४५	बालज्योति प्रा.वि., केल्वास	१०९५२०			
४६	शान्ति प्रा.वि. डुडा बेलटाकुरा	११६५००			
४७	बाल मा.वि. स्वर्गद्वारी खाल	५०३७८५			
४८	शिद्धबाबा प्रा.बि.बेलबास	८१०००			
४९	जनशान्ती प्रा.वि सल्लूडाडा	७७५००			
५०	बालशिक्षा प्रा.वि वर्तन भिगृ	३५६००			

यस नगरपालिका अन्तर्गत संचालित सामुदायिक विद्यालयहरुमा कक्षा वालविकास देखि कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीहरुका लागि प्राति हाजिरी दिन वढिमा १८० दिन सम्मको लागि प्रति विद्यार्थी रु १५। रुपैयाको दरले निकासा दिदा प्रथम, दोस्रो र तेस्रो गरी ३ किस्ताको जम्मा निकासा रकम रु १ करोड १८ लाख ९७ हजार ७ सय ८५ रुपैया रहेको छ।

क्रियाकलाप	विवरण
श्रम बजारको नतिजामा सुधारका लागि गरिएका पहलहरु	रोजगार सम्बाद मञ्चको गठन तथा संचालन
गुणस्तरयुक्त र उपयोगी पूर्वाधार निर्माणका लागि पहलहरु	केही आयोजनाहरुमा पालिकाबाट/वडाबाट लागत साझेदारी गरिएको
आन्तरिक रोजगारी सिर्जनाका लागि गरिएका प्रयासहरु	रोजगार रणनिति निर्माण कार्य सम्पन्न ।

एकिकृत श्रम तथा रोजगारी सेवा प्रवाहका लागि गरिएका पहलहरु	बैदेशिक रोजागरीमा जान चाहेका श्रमिकहरुलाई परामर्श, श्रम स्वीकृतीको लागि आवेदन भर्ने कार्य आदी ।
साझेदारी र समन्वयका लागि गरिएका पहलहरु	पालिकाका/वडा, वन उपभोक्ता समितिबाट रोजगारी सिर्जना ।

- आलु बालीको पकेट कार्यक्रम अन्तर्गत स्वर्गद्धारी नगरपालिका वार्ड नं. 4, गोठीबाङ र वार्ड नं. 5, सारीमा 140 रोपनी क्षेत्रफलमा आलु बालीको क्षेत्र विस्तार भएको छ । आलु बालीमा यान्त्रिकरणको लागि वार्ड नं 4, गोठीबाङमा ६ थान मिनिटिलर र वार्ड नं. 5, सारीमा 4 थान मिनिटिलर वितरण भएको छ ।
- उन्नत प्रविधि हस्तान्तरण कार्यक्रमा ५० प्रतिशत अनुदानमा टनेल– 26, मल्चिङ– 16, ईलेक्ट्रीक स्प्रे टंकी– 20, थोपा सिंचाई– 9 वितरण गरि व्यवसायिक तरकारी खेतिको क्षेत्रको विस्तार भई कृषकको आय आर्जनमा थप टेवा पुगेको,
- फलफूल प्रवर्द्धन कार्यक्रम (सुन्तला, कागती) अन्तर्गत वार्ड नं 2 धानबाङ, वार्ड नं. 3,नेवारे, वार्ड नं 9, मगरीटोलमा सुन्तला, कागती गरी जम्मा 3770 गोटा विरुवा वितरण भई 188 रोपनी क्षेत्रफलमा सुन्तलाजात फलफूलको क्षेत्र विस्तार भएको साथै हरियाली प्रवर्द्धनमा थप टेवा पुगेको ।
- सुन्तलाजात फलफूल खेतीका आवश्यक पर्ने विभिन्न समाग्री औजार तथा उपकरणहरु क्यारेट, निलोतुथो, चुना, कोदालो, सिकेचर, आरी, इलेक्ट्रिक स्प्रे टंकी तथा फुट स्प्रेयरहरु वितरण भएको छ।
- खाद्यान्न बाली, तरकारी बाली, तेलहन बाली, दलहन बाली, नगदे बाली तथा फलफूल बालीमा विभिन्न रोग, किराहरुले पुर्याउने क्षति न्यूनिकारण तथा उत्पादकत्व बृद्धि गर्न 2149 प्याकेट ढुसीनाशक, 143 गोटा किटनाशक र 1200 गोटा सुक्ष्मतत्व वितरण गरिएको छ ।

- स्वर्गद्धारी नगरपालिकाको न्यूनतम समर्थन मुल्यमा खरिद तथा व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी 2079 जारी भएको छ । न्यूनतम समर्थन मुल्यमा प्रोत्सहन कोष स्थापना गरिएको छ र सोही कोषबाट कार्यविधि बमोजिम कृषकहरुलाई 9 वटा बालीहरुमा कृषकहरुलाई नगद प्रोत्सहन अनुदान उपलब्ध गराईएको छ ।
- स्वर्गद्धारी नगरपालिका, कृषि विकास शाखा, कृषि तथा जिविकोपार्जन प्रवर्द्धन परियोजना तथा कृषि तथा पशु विकासमा आधारित साना किसान तथा यूवा उद्यमशिलता विकास साझेदारी परियोजनाको सहकार्यमा कृषि हाटबजार तथा संकलन केन्द्र संचालन गरिएको छ ।
- रैथाने बाली प्रवर्द्धन कार्यक्रम अन्तर्गत वार्ड नं. 2 धानबाङमा स्वर्गद्धारी सामुदायिक मगर होम स्टे संग भएको सम्झौता अनुसार 75 रोपनी फापर खेतीको क्षेत्र विस्तार भएको, मेसिनरी औजार (2 थान मिनिटिलर), 15 थान मिक्चर वितरण भएको छ ।
- नगरपालिकाको 9 वाटै वार्डमा जैविक मल तथा गोठेमल सुधार सम्बन्धी तालिम सम्पन्न भई 177 महिला, 37 पुरुष, 53 जनजाति, 39 दलित, 120 अन्य लभान्वित भएका थिए ।
- व्यवसायिक च्याउ खेतीको प्रवर्द्धन गर्न वार्ड नं. 3 मा 7 जनाको समूहमा समुहिक रुपमा च्याउको लागि टनेल निर्माण गरी व्यवासयिक रुपमा च्याउ खेती भईरहेको ।
- मौसम अनुसारको विभिन्न तरकारीहरुको मिनिकिट वितरण भई कृषकहरु तरकारीमा आत्मनिर्भर गर्न करेसाबारीलाई प्रोत्सहन गर्न 290 सेट तरकारीको किट वितरण गरिएको

योजना कार्यन्वयनमा समस्या तथा चुनौती र समाधानको उपायहरु

- **भौगोलिक बिषमताले गर्दा सबै ठाउँमा सजिलै नियमित अनुगमन हुन नसक्नु ।**
- **दक्ष जनशक्ति (सिकर्मी /डकर्मी) को अभाव हुनाले निर्माण कार्य गुणस्तरीय हुन नसक्नु ।**
- **टुक्रे योजनाहरुको कारणले योजनाहरुको प्रभावकारिता घट्दै जानु ।**

- आर्थिक बर्षको अन्त्यमा मात्र संघीय/प्रादेशिक बजेट उपलब्ध हुनु ।
- प्राविधिक उपकरण /निर्माण सामग्री परिक्षण प्रयोगशाला नहुनु ।
- भवन तथा नक्सापासमा सरोकारवाला हरुलाई उत्प्रेरित गर्न नसक्नु ।
- अब्बल परामर्शदाता छनौट हुन नसक्नाले यथार्थपरक विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार हुन नसक्नु जसकारण कार्यन्वयनको क्रममा चुनौतीहरु आइपर्नु ।
- वास्तविक आवस्यकताअनुरुप योजना बन्नुको सट्टा उपलब्ध बजेटको आधारमा योजना तर्जुमा हुनु जसले गर्दा संचालित योजनाहरु अधुरो रहन जानु ।
- पर्याप्त मात्रामा बजेट नभएपनि लगत अनुमान स्वीकृत हुनु र ठेक्का व्यवस्थापन गर्न हतार गर्नु
- योजनाहरुमा देखिने विवाद ले गर्दा योजना अवधि लामो हुन जानु जसकारण सम्झौता भएका आयोजनाहरु पनि कार्यन्वयन हुन नसक्नु र कार्यन्वयन भएतापनि अत्यन्तै विवादित हुनु ।
- निर्माण व्यवसायीहरुले तोकिएको समय सिमा भित्र योजना सम्पन्न गर्न नसक्नु ।गरेका काम हरुपनि न्यून गुणस्तरको गर्न खोज्नु ।कतिपय निर्माण व्यवसायीले आफ्नो क्षमताभन्दा बढी ठेक्का लिने र काम अलपत्र पारिदिनु ।
- कागजी प्रक्रियामा लामो समय लाग्ने र योजना सम्बन्धि तालिमको अभावले गर्दा ,योजनाको काममा उपभोक्ताहरु उदासिन रहनु
- योजना कार्यन्वयनमा वास्तविक उपभोक्ताको सक्रियता घट्दै जानु र समितिको/ठेक्काको नाममा **sub-Contracting** जस्ता काम हरु व्याप्त हुनु
- योजना तर्जुमा हुनु अघिनै निर्माणस्थलको उचित व्यवस्था ,सम्बन्धित विवाद निरुपण भइ बजेटको श्रोत सुनिश्चित हुनु पर्नेमा ,सुरुमा बजेट (संघ/प्रदेश/स्थानीय तह) आइसकेपछि मात्र अन्य व्यवस्थापनमा लाग्नु जसले गर्दा आयोजना असफल हुनु ।
- वस्तीस्तरबाट वास्तविक आवस्यकता र मागको अधारमा योजना बैंक निर्माण गर्ने र योजना बैंक/आवधिक योजना अनुरुप कार्यक्रमहरु तर्जुमा गर्नुपर्ने ।
- उपभोक्ता समिति र निर्माण व्यवसायीलाइ थप व्यवसायिक बनाउन तालिम र ऐन नियम सम्बन्धि गोष्ठीको व्यवस्था गर्नु पर्ने ।

- आयोजनमा अनुगमन र निरिक्षणको कार्य नियमित गर्नुपर्ने र आवस्यक सल्लाह सुझाव समयमै प्रदान गर्ने ।
- आयोजनाहरुको निर्माणस्थलको व्यवस्था , सम्बन्धित विवादहरु टुंगिएपछि र लागत अनुमान तयार भएपछि मात्र बजेटको व्यवस्था गर्ने ।
- परामर्शदाता छनौट गर्दा योग्यताको आधारमा छनौट गर्नु पर्ने र सोझै खरिद लाइ निरुत्साहित गर्नु पर्ने ।
- नक्सापास लाइ प्रोत्साहन गर्न चरणबद्द रुपमा डकर्मी तालिम/अभिमुखीकरण कार्यक्रम /घर दैलो कार्यक्रम र नीतिगत व्यवस्था गर्ने ।

१.   केहि अन्य आयोजनाहरु (पि.एच.सी देखि पुलिस पोस्ट हुदै स्वर्गद्वारी एकेडमी जोड्ने बाटो)

परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्।

२.   केहि अन्य आयोजनाहरु (शान्तिपार्क निर्माण-स्व.न.पा-०८)

परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्।
